


# MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

(MEF)

## PROGRAMME DE RELANCE ÉCONOMIQUE

(PROREC)

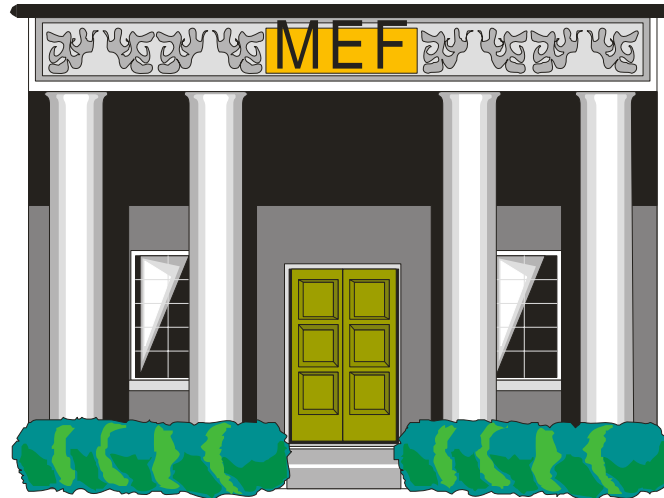


# RAPPORT D'ÉTAPE N° 3

**COORDINATION GÉNÉRALE  
(PROREC)**

**OCTOBRE 2005**

**204, Palais des Finances  
Rue Mgr Guilloux  
Port-au-Prince, Haïti**

**Phone: 299-1700/299-1701  
Fax: 299-1732/2999-1733  
Site Internet: [w.w.w/mefhaiti.gouv.ht](http://www.w/mefhaiti.gouv.ht)**



## **TABLE DES MATIERES**

<b>AVANT-PROPOS</b>	<b>3</b>
<b>LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS</b>	<b>4</b>
<b>TABLE DES MATIERES</b>	<b>6</b>
<b>I. INTRODUCTION</b>	<b>7</b>
1.1. CONTEXTE	7
1.2. OBJECTIFS DU PROREC	7
1.3. COMPOSANTES DU PROREC	7
<b>II. REALISATIONS DU PROREC AU 30 SEPTEMBRE 2005</b>	<b>8</b>
2,1 INFRASTRUCTURES ROUTIERES	8
2.2 INFRASTRUCTURES AGRICOLES	13
2.3 INFRASTRUCTURES SANITAIRES	16
2.4 APPUI AUX INITIATIVES DE DEVELOPPEMENT LOCAL	21
2.5 APPUI AU RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL DU MPCE	23
2.6 INTERVENTIONS SPECIFIQUES	27
2.6.1 Subventions aux Associations	27
2.6.2 Promotion Emplois Productifs	35
2.6.3 Soutien aux Jeunes Chômeurs	38
2.6.4 Soutien aux Etudiants	40
<b>III. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES</b>	<b>42</b>
<b>ANNEXES</b>	<b>45</b>

## **AVANT PROPOS**

La Coordination Générale du Programme de Relance Economique (PROREC) en vue d'informer les responsables, les bénéficiaires directs et indirects ainsi que le public en général sur l'état d'avancement dudit programme, se fait le devoir de soumettre à leur appréciation respective le présent rapport d'étape N 3.

Après un bref rappel du contexte, des objectifs et des composantes du programme, les principales réalisations au 30 septembre 2005 des sous-programmes, projets et interventions spécifiques sont présentées sur la base des informations fournies par les différentes Coordinations Sectorielles au sein des Ministères responsables d'exécution.

Six (6) sous-programmes répartis en 80 projets et 4 volets d'interventions spécifiques composent ce programme. Ce sont :

- le sous-programme d'Infrastructures Routières avec 14 projets ;
- le sous-programme d'Infrastructures Agricoles avec 26 projets ;
- le sous-programme d'Infrastructures Sanitaires avec 22 projets ;
- le sous-programme d'Appui aux Initiatives de Développement Local avec 7 projets ;
- le sous-programme d'Appui au Renforcement Institutionnel du MPCE avec 11 projets ;
- le sous-programme d'Interventions Spécifiques avec 4 Volets d'Interventions ;

Comparativement aux résultats consignés dans le rapport d'étape No 2, le programme a eu une progression de 15.2% passant de 47.5 % au 31 juillet à 62.7% au 30 septembre 2005 en termes de résultats obtenus à date,

Au total le Programme de Relance Economique (PROREC) a décaissé au 30 septembre 2005 un montant de **715.865.431.00 de gourdes** en faveur des projets et interventions spécifiques, soit 60% des prévisions budgétaires rectifiées s'élevant à **1,331.878.500.00 de gourdes** et a contribué à la création d'environ **12.900 emplois** pendant les trois derniers trimestres de l'année fiscale 2004-2005.

La Coordination Générale du PROREC espère fermement que pour le prochain rapport d'étape au 31 décembre 2005 tous les projets encore en exécution et ceux qui viennent de débiter seront achevés à la satisfaction des responsables et des bénéficiaires directs et indirects dans les dix départements géographiques du pays.

## **LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS**

PROREC	:	Programme de Relance Economique
MEF	:	Ministère de l'Economie et des Finances
MPCE	:	Ministère de la Planification et de la Coopération Externe
MARNDR	:	Ministère de l'Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural
MSPP	:	Ministère de la Santé Publique et de la Population
MAST	:	Ministère des Affaires Sociales et du Travail
MCFDF	:	Ministère à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme
MCIT	:	Ministère du Commerce de l'Industrie et du Tourisme
IHSI	:	Institut Haïtien de Statistique et d'Informatique
INAGHEI	:	Institut National de D'Administration de Gestion et des Hautes Etudes Internationales
FDI	:	Fonds de Développement Industriel
UCAONG	:	Unité de Coordination des Activités des ONG
ONG	:	Organisations Non Gouvernementales
DSRP	:	Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté
PIP	:	Programme d'Investissement Public
USAID	:	Agence Américaine de Développement International
ACDI	:	Agence Canadienne de Développement International
DOSS	:	Direction d'Organisation des Services de Santé
DDRH	:	Direction Départementale des Ressources Humaines
CHAPI	:	Centre Haïtiano Arabe Plan International
CHOSCAL	:	Centre Hospitalier de Sainte Catherine Labouré

CDS	:	Centre pour le Développement de la Santé
CCI	:	Cadre de Coopération Intérimaire
CSCCA	:	Cour Supérieur des Comptes et du Contentieux Administratif
MINUSTHA	:	Mission des Nations Unies pour la Stabilisation d'Haïti
HUEH	:	Hôpital de l'Université d'Etat d'Haïti
PVVIH	:	Personnes Vivant avec le Virus d'Immunodéficience Humaine
NTIC	:	Nouvelles Technologies d'informatiques et de Communications
DSF	:	Direction de la Santé Familiale
ST	:	Sécurité Transfusionnelle
BID	:	Banque Interaméricaine de Développement
DPES	:	Direction de la Programmation Economique et Social
DEC	:	Direction Evaluation et Contrôle
DCE	:	Direction de Coopération Externe
UDI	:	Unité de Documentation et d'Informatique
NIF	:	Numéro d'Identification Fiscale
FYEL	:	Fòk Youn Ede Lòt
AFA	:	Association Femmes en Action
BERAKA	:	Association pour le développement
AEPS	:	Atelier d'Ebénisterie des professionnels Salésiens
SOCRADENA	:	Société de création d'activités et de développement National
CGPVP	:	Comité de Gestion de Propriété Village Plus
Rn1	:	Route Nationale #1

Rn2 : Route Nationale #2  
Blvd : Boulevard  
% : Pourcentage  
Kms : Kilomètres  
Gdes : Gourdes  
US\$ : Dollars américains

## **I- INTRODUCTION**

### **1.1 CONTEXTE**

Afin de rompre avec les pratiques qui ont contribué à fragiliser une population de plus en plus exposée à la précarité et à l'inadéquation des mécanismes traditionnels de survie, le Gouvernement de transition a élaboré le Cadre de Coopération intérimaire (CCI) avec la participation et la consultation des principaux acteurs de la société Haïtienne et l'appui des agences internationales. Les principaux objectifs de ce Cadre de Coopération Intérimaire sont :

- Contribuer à une bonne gouvernance politique et au dialogue National ;
- Favoriser la création rapide d'emplois ;
- Améliorer la sécurité et la Protection Sociale ;
- Promouvoir la Protection et la Réhabilitation de l'Environnement ;
- Améliorer les infrastructures de base ;
- Recapitaliser le secteur privé ;

A cause de la lenteur des premiers décaissements de fonds devant permettre la concrétisation de ces objectifs, le gouvernement de transition a mis en place un Programme de Relance Economique (PROREC) dont l'ambition est d'aller au-delà de la stabilisation macro-économique et de promouvoir une certaine croissance.

### **1.2 OBJECTIFS DU PROREC**

Le but principal du Programme de relance Economique est de contribuer à la satisfaction des objectifs de croissance durable et de lutte contre la pauvreté en diminuant à court terme un certain nombre de risques de conflits sociaux à travers les objectifs spécifiques suivants :

- Réhabiliter certaines Infrastructures de base (routes, voiries urbaines, hôpitaux et centres de santé, irrigation, production agricole, etc.) ;
- Créer de nouveaux emplois temporaires et contribuer à la résorption du chômage des jeunes ;
- Soutenir le développement de petites et moyennes entreprises de production ;
- Subventionner les associations et institutions à caractère social dans leur travail d'encadrement des jeunes démunis et des personnes défavorisées ;
- Améliorer l'accès aux services de base.

### **1.3 COMPOSANTES DU PROREC**

Les principales composantes du PROREC sont les suivantes :

- Réhabilitation des Infrastructures Routières
- Réhabilitation des Infrastructures Sanitaires
- Réhabilitation des Infrastructures Agricoles
- Appui aux Initiatives de Développement Local

- Renforcement Institutionnel du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE)
- Interventions Spécifiques

## II. REALISATIONS DU PROREC AU 30 SEPTEMBRE 2005


### 2.1- SOUS-PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES

A ce jour, le Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) à travers le Programme de Relance Economique a décaissé en faveur du Ministère des Travaux Publics, Transport et Communication (MTPTC), responsable de ce sous-programme, un montant de **572,936.246.00** gourdes pour un total de Quatorze (14) projets, dont deux (2) nouveaux inscrits au programme par rapport au dernier rapport d'étape N0 2 et cela sur un montant total prévu de un milliard de gourdes (1,000.000.000.00), soit 57.29% des prévisions budgétaires.

Les projets ayant bénéficié de ce financement sont les suivants :


1. Protection des berges de la Ravine du Sud ;
2. Réhabilitation de la Route Gonaïves-Anse Rouge ;
3. Construction du Pont Girado à Frères ;
4. Adoquinage Cote Plage 18 à Carrefour ;
5. Construction d'un Gué à la Ravine Peredo/Route Marigot /Belle Anse dans le Sud-Est ;
6. Réhabilitation de la RN2 (tronçon Pont Chalon Pont- Miragoâne) ;
7. Réhabilitation Route Cap-Milot ;
8. Drainage et Assainissement de la Route Fonds Parisien- Fonds Verrettes ;
9. Protection de la Route de Jacmel PK : 9 + 700 à 9 + 760 ;
10. Réhabilitation Pont Barque ;
11. Réhabilitation de la RN1 (blvd des Industries – Bon Repos) ;
12. Recalibrage du lit de la Rivière Cormier à Léogâne ;
13. Entretien, Réhabilitation et Assainissement de Voirie Urbaine de la zone métropolitaine de Port-au-Prince ;
14. Création d'emplois, Entretien des ouvrages de drainage et des routes en terre battue ;

Le graphique suivant montre l'état d'avancement physique et financier de l'ensemble des projets du sous-programme d'infrastructures routières du PROREC.

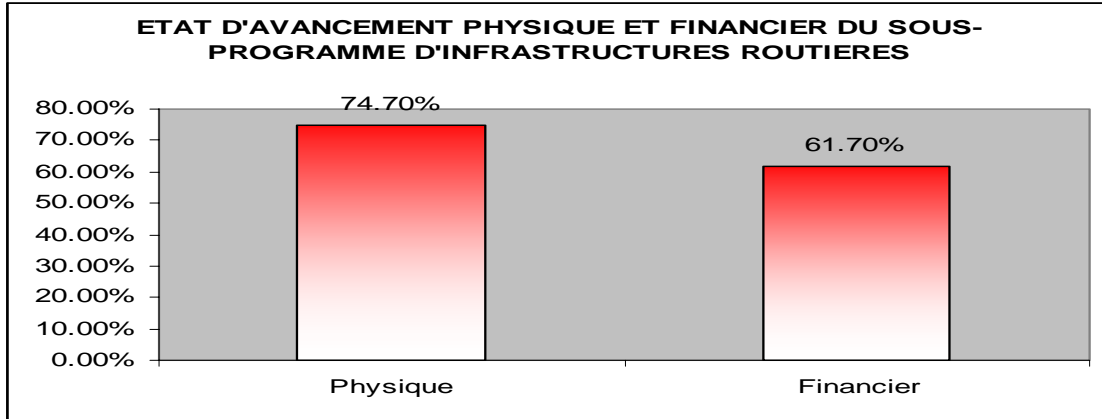


Le sous-programme d'Infrastructures Routières au 30 septembre 2005 a donc réalisé 74.7% de ses objectifs en termes de travaux exécutés et utilisé 61.7% des ressources financières mises à sa disposition.

Le graphique suivant monte la progression du sous-programme par rapport au dernier rapport d'étape No 2, soit une augmentation de 23.45% par rapport aux résultats publiés dans le rapport d'étape No 2 qui étaient de 51.25%.

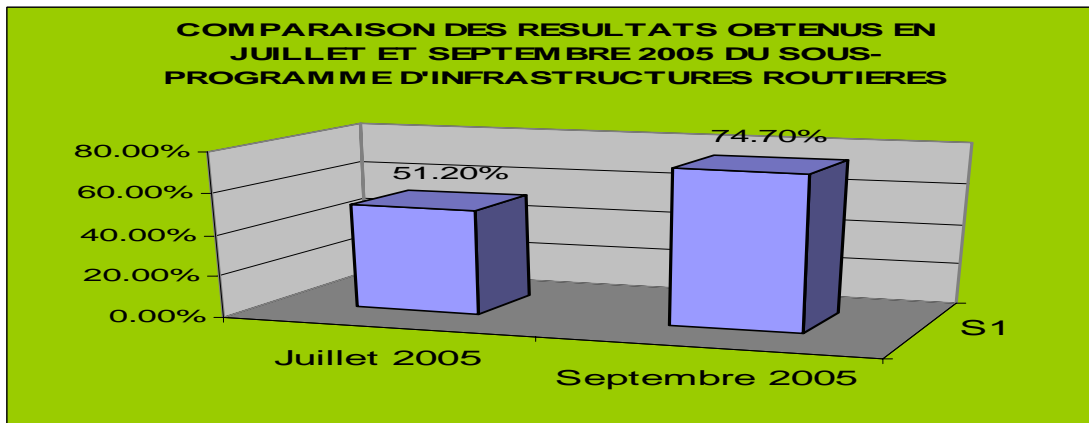

D'autre part dix (10) des projets pour lesquels des informations ont été communiquées à la Coordination Générale du PROREC ont créé **8.193 emplois** d'une durée moyenne de 2 à 3 mois répartis comme le montre le graphique suivant.

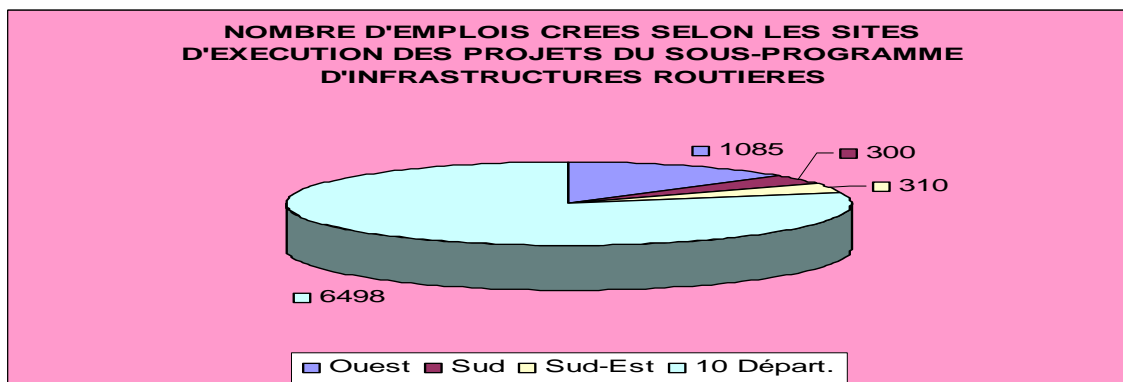

Par ailleurs quatre (4) de ces projets suspendus pour diverses causes sont actuellement l'objet de négociation avec les firmes contractantes en vue de la reprise des activités et trois (3) autres ont été finalisés au cours de cette période.

Les principales caractéristiques, les réalisations, les dépenses effectuées ainsi que le nombre d'emplois créés pour chacun des projets du sous-programme se présentent comme suit :

### **2.1.1 Protection des berges de la Ravine du Sud à Camp Perrin**

Ce projet devait exécuter les activités suivantes :

- Démolition de l'ouvrage en maçonnerie existant
- Mur en gabion à défaire
- Remblai compacté
- Excavation, reprofilage du lit de la rivière
- Construction ouvrage en maçonnerie

Il a été divisé en trois (3) lots d'activités (I, II, III) pour une durée de six (6) mois, mais n'est pas encore arrivé à terme à cause du retard enregistré dans le décaissement des fonds. Cependant, les travaux du lot I sont achevés, les activités prévues dans le lot II ont été exécutées à 21 % et celles du lot III à 36%. Le projet a donc réalisé 52 % des activités envisagées avec des dépenses de l'ordre de 30,473.044.50 gourdes sur les 50,000.000.00 décaissés en sa faveur au cours de la période, soit 60.9% d'avancement financier. Par ailleurs, le projet a généré à ce jour 300 emplois.

### **2.1.2 Réhabilitation de la Route Gonaïves-Anse Rouge**

Ce projet consistant en la réhabilitation de 54 kms de route est subdivisé en trois (3) lots de 18 Kms chacun. Néanmoins, les activités débutées en Septembre 2003 ont été arrêtées depuis la période de trouble en 2004 et n'ont été exécutés que sur 6 kms. Des négociations sont en cours avec la firme d'exécution en vue du redémarrage du projet comme mentionné dans le dernier rapport d'étape No 2.

Des 10,000.000.00 de gourdes décaissées pour l'exécution du projet, 4,510.620.00 ont été utilisées pour payer des arriérées de dettes sur les travaux du Lot I, soit 45.10% d'avancement en termes financiers.

### **2.1.3 Construction du Pont Girardot à Frères**

La construction du pont Girardot à Frères consiste dans la réalisation des activités suivantes :

- Implantation du projet
- Fouille en terrain ordinaire
- Remblai provenant
- Gabions
- Coffrages ordinaires
- Etaisements et cintres
- Béton de propreté B150
- Béton classe A

- Armatures pour béton
- Gargouilles
- Garde Corps
- Maçonnerie

Le dernier rapport du PROREC (rapport d'étape #2) avait fait état d'un taux de progression de 50%, en dépit du fait que les activités envisagées ont démarré avec un certain retard à cause d'exigences administratives et techniques, l'avancement physique peut être estimé à 77 % pour un montant de 4,809.066.93 gourdes sur les 10,501.460 gourdes décaissées, soit 45.8% d'avancement en termes financiers De plus, ce projet a permis la création de 50 emplois.

#### **2.1.4 Adoquinage Cote Plage 18 à Carrefour**

A la date du 30 Juin 2005, les activités de ce projet qui consistaient en l'adoquinage de 986 mètres linéaires de chaussée ont été finalisées à 100% et le Gouvernement Haïtien a procédé à son inauguration le 5 Septembre 2005. Toutefois, certaines activités ont été financées par l'Agence de Coopération Internationale à hauteur de 14,790.000.00 de gourdes avec une participation du Gouvernement Haïtien de l'ordre de 10,879.450.00 de gourdes. Le coût total s'est élevé à 25,669.450.00 gourdes. Il est important de signaler que ce projet a généré 150 emplois dont 10 tenus par des femmes.

#### **2.1.5 Construction d'un Gué sur la Ravine Pérédo/Route Marigot /Belle Anse dans le Sud-est.**

Les travaux de construction du Gué sur la rivière Peredo sont terminés depuis le mois de Juin 2005. Toutefois, les délais prévus dans le contrat pour l'achèvement travaux n'ont pas été respectés à cause d'une erreur qui s'était glissé dans le devis estimatif. Un montant de 8,404.438.00 gourdes a été décaissé pour l'exécution du projet dont 7,060.354.02 gourdes, soit 84% ont permis la réalisation des activités prévues. Le projet a généré 200 emplois.

#### **2.1.6 Réhabilitation de la RN2 (tronçon Pont Chalon Pont- Miragoâne)**

La réhabilitation de la Route nationale #2 (RN2) comprend ce qui suit :

- Réhabilitation de 10kms de route
- Travaux préparatoires
- Terrassement
- Chaussées
- Drainage et assainissement
- Signalisation et travaux divers

Ce projet a débuté en Février 2003 pour une durée de 16 mois. Les travaux n'étant pas arrivés à terme, la firme d'exécution a formulé une requête de prolongation du contrat pour une durée de 12 mois qui malheureusement n'a pas été respecté. Ainsi, les activités envisagées dans le cadre de ce projet n'ont été réalisées qu'à 63 % avec 54% des fonds décaissés. Par ailleurs, le projet a permis la création de 350 emplois.

### **2.1.7 Réhabilitation Route Cap-Milot**

La réhabilitation de 9kms de la route Cap-Haïtien vers Milot dans le nord n'a pas progressé à cause d'un arrêt des travaux depuis 2004. Mais, suite à des négociations entre les parties intéressées, un avenant au contrat a été signé entre les parties et les travaux ont redémarré au cours du mois de Septembre 2005.

### **2.1.8 Drainage et Assainissement de la Route Fonds Parisien- Fonds Verrettes**

Le projet de drainage et d'assainissement de la route Fonds Parisien – Fonds Verrettes est un nouveau projet qui a démarré le 20 Mai 2005 et pour lequel la Coordination Générale du PROREC ne dispose pas encore d'information sur ses principales caractéristiques techniques. Il accuse un état d'avancement physique de 8 % avec 25% des ressources financières décaissées, soit 6.381.117.00 de gourdes sur les 25.325.650.00 de gourdes décaissées. Le nombre d'emplois créés par ce projet est de 99.

### **2.1.9 Protection de la Route de Jacmel (PK : 9 + 700 à 9 + 760)**

La protection de la route de Jacmel qui consistait en des activités de reconstruction de 60 mètres linéaires (ml) en asphalte et en béton a pris fin depuis le 30 Avril 2005 avec l'utilisation de 98 % des fonds alloués alors que certains travaux complémentaires ont été effectués au cours du mois de Juillet 2005. Le projet a favorisé la création de 110 emplois soit 11.00 Homme/jour.

### **2.1.10 Réhabilitation Pont Barque**

Ainsi que le notait le rapport d'étape #2, les travaux n'ont pas repris à cause du retard enregistré dans l'approbation du contrat par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) selon le MTPTC. Cependant, les démarches sont encore en cours pour permettre le redémarrage du projet qui bénéficie d'une allocation de 8,400.000.00 gourdes.

### **2.1.11 Réhabilitation de la RN1 (blvd des Industries – Bon Repos)**

Le projet de réhabilitation du tronçon de la RN1 (Blvd des Industries-Bon repos) sur 8 kms avec un coût total estimé à 516,275.318.00 gourdes est en cours d'exécution. De ce montant, 280.000.000 gourdes étaient programmées pour l'exercice fiscal 2004-2005. Toutefois, à cause du retard enregistré dans le décaissement des fonds, le projet accuse un avancement physique de 60% contre 78% d'avancement en termes financiers. Le projet a créé 400 emplois.

### **2.1.12 Recalibrage du lit de la Rivière Cormier à Léogâne**

Les actions envisagées sont le recalibrage du lit de la rivière Cormier et le curage d'un dalot à Léogâne.

Le projet dont une bonne partie a été réalisée par la MINUSTHA et le MTPTC n'a pas pu être achevé à cause des crues de la rivière Cormier qui ont complètement modifié le site du projet. Un nouveau Contrat est en train d'être négocié pour une solution durable. Néanmoins, 26% des fonds alloués au projet, soit 6.000.000.00 de gourdes sur les 12.000.000.00 de gourdes décaissées ont été utilisés sans que pour autant le projet ait pu progresser de manière substantielle. Le nombre d'emplois générés est de 36.

### **2.1.13 Entretien, Réhabilitation et Assainissement de Voirie Urbaine à Port-au-Prince**

Ce projet subdivisé en 20 lots dont 9 sont achevés et un fut annulé en raison de l'incapacité technique et financière de la firme d'exécution à effectuer les travaux prévus dans le délai contractuel et de l'abandon du chantier par cette dernière a pu réaliser dans l'ensemble 74.48 % de ses activités avec l'utilisation de 82 %, soit 202.306.960.00 de gourdes sur les 247.817.410.00 de gourdes décaissées.

### **2.1.14 Création d'Emplois**

De Décembre 2004 à Octobre 2005, 649,800 Hommes/jour ont travaillé à travers les 10 départements géographiques du pays dans l'entretien des ouvrages de drainage, des routes primaires et secondaires, et des 107,500.000.00 gourdes allouées au projet, 62,989.922.23 ont été dépensées, soit 58.6%.

## **2.2- SOUS-PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES AGRICOLES**

La Coordination Générale du Programme de Relance Economique (PROREC) n'a pas reçu d'informations sur l'état d'avancement physique et financier des 17 projets du Ministère de l'Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) cités dans le rapport d'étape #2. Il s'ensuit que ce rapport fera seulement état de l'évolution physique et financière de quatre (4) des Neuf (9) nouveaux projets retenus pour lesquels des informations ont été communiquées. Un décaissement de 20,000.000.00 de gourdes a été effectué en faveur de ces projets au cours du trimestre juillet-septembre, cependant le MARNDR dans une correspondance datée du 21 septembre 2005 a informé le MEF de l'utilisation d'une partie des fonds, soit 10 millions de gourdes pour honorer d'autres engagements en faveur d'autres projets non inscrits au Programme à savoir :

1. CNSA	1,200.000.00 Gdes
2. INCAH	1,461.440.00 Gdes
3. PSSA	1,250.000.00 Gdes
4. PIA	2,200.000.00 Gdes
5. Projet d'extension et d'Appui à la Production et à la Commercialisation du café, du bambou, des fruits dans les régions de Marmelade, de Jacmel et de la Grande-Anse	2,250.000.00 Gdes
6. Programme de Micro-Réalisation/PET	450.000.00 Gdes
7. Formation Hydo & Hydrogeol à Santo Domingo	438.560.00 Gdes
8. Sous DDA Ouest	750.000.00 Gdes

Les Neuf (9) projets inscrits au programme pour un montant total prévisionnel de 39,454.280.00 de gourdes sont les suivants :


1. Endiguement et correction de berges sur la Rivière Rouyonne à Léogâne ;

2. Construction de 25 citernes à l'Ile-à-vaches ;
3. Installation de 20 dispositifs de concentration de poissons (DCP) dans les régions du Nord, du Nord-Ouest et des Nippes ;
4. Protection partielle de berges sur la rivière grise (Croix-des-Bouquets)
5. Campagne de vaccination de 100.000 têtes de poulets contre le New Castel dans la Grande-Anse ;
6. Construction de 50 unités familiales de glacis (30m<sup>2</sup>) dans la Grand'Anse ;
7. Contrôle biologique de la Cochenille rose de l'hibiscus en Haïti
8. Acquisition, distribution et mise en terre de quinze mille (15.000) plantules de Papayers dans l'Ouest et l'Artibonite ;
9. Transfert de technologie en systèmes de production et transformation de la noix de cajou et du manioc.

Pour ces neuf (9) projets, la Coordination Générale du PROREC n'a reçu d'informations que sur l'état d'avancement de quatre (4) d'entre eux. Il est donc évident que la Coordination Générale du PROREC se trouve dans l'impossibilité d'apprécier l'état d'avancement global du sous-programme d'Infrastructures Agricoles durant la période sous étude ni d'apprécier son évolution par rapport aux résultats consignés dans le dernier rapport d'étape du mois de juillet 2005.

En effet, sur le plan de la réalisation des activités prévues, les informations ne sont disponibles que pour deux (2) projets portant le pourcentage moyen de réalisation à 49.5%. Cependant les informations financières étant disponibles pour les 4 projets concernés, l'état d'avancement financier accuse une moyenne de 52.6%.

Le graphique suivant nous montre l'état d'avancement Physique et financier des projets sous étude.

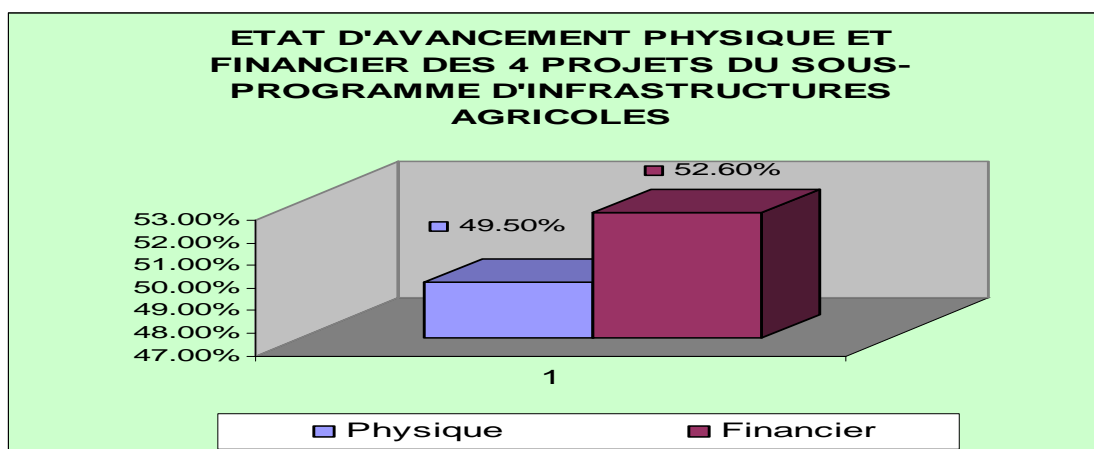

En fait, alors que les prévisions budgétaires pour ces 4 projets sont de l'ordre de 10,721.085.00 de gourdes, le MARNDR a effectivement décaissé un montant de 16,083085.00 de gourdes ce qui représente un dépassement de 50%.

Cela explique peut-être que les 5 autres projets inscrits au PROREC n'aient pu bénéficier de décaissement à partir des 20 Millions de gourdes transférées par le Ministère de l'Economie et des Finances au Ministère de l'Agriculture.

Les projets pour lesquels des informations ont été communiquées sont les suivants :

### **2.2.1 Construction de Glacis dans la Grand'Anse**

Le Ministère de l'Agriculture avait envisagé la construction de 50 unités familiales de glacis de 30m<sup>2</sup> de superficie au niveau de cinq (5) communes dans la Grand'Anse pour un coût total de 1,420.000.00 de gourdes. Entre-temps, selon le dernier rapport de la Coordination Sectorielle du PROREC à ce Ministère, le nombre d'unités de citernes familiales a été réduit à 35. La construction de 20 d'entre elles à Beaumont et à Pestel a été confiée à la firme AGROGENTEK pour un montant de 548.696.80 gourdes. La firme ARGECO a été chargée de la construction de 15 d'entre elles à Moron, Chambellan et Abricots pour un montant de 205.490.10 de gourdes.

Les 20 unités confiées à la firme AGROGENTEK ont été construites, tandis que sur les 15 unités confiées à la firme ARGECO seules 8 d'entre elles ont pu l'être, soit un total de 28 unités, représentant 80% des 35 unités prévues.

A ce jour, la firme AGROGENTEK a pleinement justifié le montant décaissé en sa faveur. Ce n'est pas le cas de la firme ARGECO. Ainsi, des 980.000.00 gourdes décaissées pour l'exécution des 35 unités de citernes familiales dans les 5 communes concernées, un montant de 548.696.80 gourdes, soit 55.9% a été justifié.

### **2.2.2 Construction de 25 Citernes à l'Île-à-Vaches**

Pour ce qui est de l'évolution de ce projet, les travaux viennent de débuter suite à des négociations ayant abouti au choix de la firme locale SODECO. Il faudra donc attendre le prochain rapport du PROREC pour être informé de l'état d'avancement physique et financier du projet pour lequel, 678.000.00 gdes ont été décaissées.

### **2.2.3 Consolidation de berges et curage du lit de la Rivière Rouyonne à Léogane**

Ce projet consiste à construire 3.000 mètres linéaires de berges, effectuer le curage de 3 km du lit de la rivière, mettre en place 10.000 boutures et motiver/sensibiliser les 1.000 bénéficiaires potentiels.

Les réalisations à ce jour portent sur l'endiguement de la rivière sur 700 mètres linéaires, soit 23 % et le curage sur 500 mètres linéaires, soit 16 % montrant un état d'avancement physique global de 19% en moyenne.

Sur le plan financier, 2,000.000.00 de gourdes ont été décaissées en faveur de ce projet pour lequel des dépenses de l'ordre de 1,094.400.00 gourdes ont été effectuées, soit 54.7% des avances de fonds.

### **2.2.4 Contrôle biologique de la Cochenille Rose de l'Hibiscus en Haïti.**

L'objectif principal de ce projet est le contrôle biologique de la Cochenille Rose de l'Hibiscus (CRH) en Haïti, insecte exotique, polyphage et dévastateur, attaquant plus de

trois cent (300) espèces différentes de plantes dont plusieurs espèces forestières, fruitières, ornementales, maraîchères et herbacées.

Aussi, la réalisation des objectifs de ce projet permettra de :


- Diminuer à 75% les infestations de la CRH sur le territoire national.
- Doubler la production des ennemis naturels de la CRH passant de 40.000 à 80.000 par mois.
- Sensibiliser, informer et former la population.
- Informer la population sur l'importance économique de cette peste.

Le coût total de ce projet est de trois millions de gourdes (3,000.000.00 gdes). Aucune information n'est encore disponible sur les réalisations à cette date. On sait seulement que sur les 1,775.000.00 de gourdes décaissées en faveur de ce projet par le Ministère de l'Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) à titre d'avance, 940.124.43 gourdes ont été dépensées

### **2.3-SOUS-PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES SANITAIRES**


Le Budget d'Investissement Public de l'exercice fiscal 2004-2005 avait prévu un montant de Quatre Vingt Cinq Millions de Gourdes (85.000.000.00 Gdes) au profit du Ministère de la Santé Publique et de la Population pour l'exécution de 22 projets inscrits au Programme de Relance Economique. De ce montant, 49,745.746.00 de gourdes ont été décaissées ce qui correspond à 58.5% des prévisions budgétaires.

L'état d'avancement physique et financier de 17 des 22 projets du sous-programme d'infrastructures sanitaires au 30 septembre 2005 peut être apprécié dans le graphique suivant.

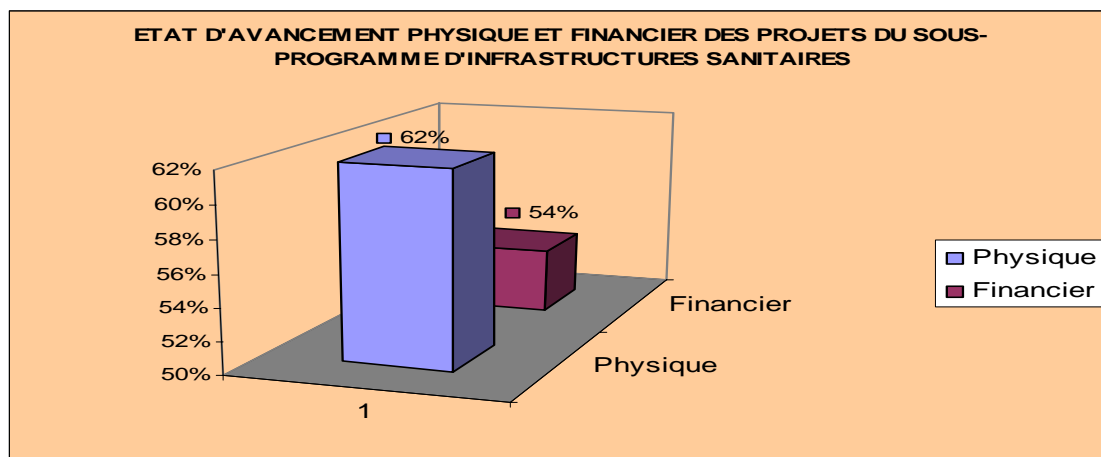

En effet des 22 projets quatre (4) n'ont pas encore démarré et un (1) a été finalisé avec des fonds autres que le Trésor Public. Il ressort donc du graphique que les 17 projets concernés accusent un état d'avancement moyen de 62% du point de vue des réalisations physiques et de 54% du point de vue financier.

Comparativement au dernier rapport d'étape No 2 sur l'état d'avancement du sous-programme au 30 juillet 2005, ce dernier accusait un état d'avancement physique de 47% tandis qu'il atteint à date 62% montrant une progression de 15% comme on peut l'observer dans le graphique suivant :

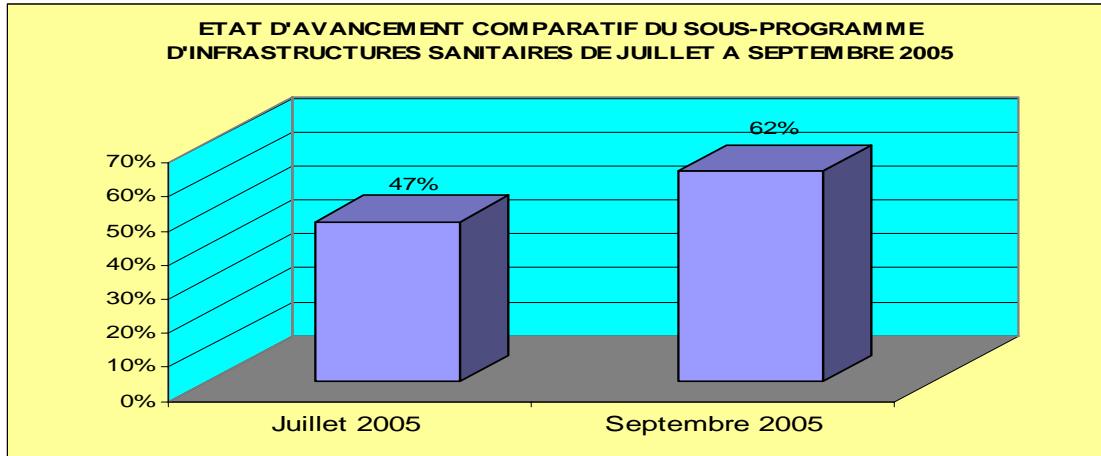

Les projets ayant bénéficié de ces décaissements sont les suivants :

### 2.3.1 Réhabilitation du Sanatorium de Port-au-Prince

L'objectif principal de ce projet était d'améliorer les conditions de travail au sein du Sanatorium. A ce jour, cet objectif 25 % de cet objectif a été réalisé à concurrence de 25%. Cela représente 8,126.769.40 de gourdes, soit 33% des 25.000.000.00 décaissées à cette fin.

### 2.3.2 Réhabilitation et Agrandissement de l'hôpital Maternité Isaïe Jeanty

Deux (2) activités ont été envisagées afin de réaliser la réhabilitation et l'agrandissement de la Maternité Isaïe Jeantye avec un décaissement de 4,019.382.08 de gourdes :

- Réhabilitation et Agrandissement de la maternité Isaïe Jantille.
- Réaménagement de la cour de l'hôpital afin de créer un environnement sain.

Les activités réalisées ont permis la réhabilitation de cet hôpital à 70% pour des dépenses de l'ordre de 2,609.559.47 de gourdes ce qui représente 66.9% des fonds alloués.

### 2.3.3 Réhabilitation et Agrandissement de l'hôpital de Port de Paix

Les activités prévues dans le cadre de ce projet étaient :

- La réalisation d'une étude technique et économique complète du projet.
- La mise en place d'une maternité répondant aux normes en la matière.

Ces actions ont progressé de 55% pour des dépenses de l'ordre de 490.000 gourdes sur les 6,000.000.00 gourdes allouées au projet, soit 8.16% des prévisions.

### **2.3.4 Achèvement des travaux du centre de Jules Fleury à Anse à Veau**

Ce projet envisage l'achèvement des travaux destiné à rendre le centre opérationnel en vue de faciliter l'accès de la population aux services de soins de santé. Ce projet vient de débiter. Pour ce présent rapport, les informations disponibles, nous révèlent une progression de 55% dans l'achèvement du centre avec l'utilisation de 783.594.56 gourdes, soit 40% des 1,958.986.00 gourdes décaissées.

### **2.3.5 Réhabilitation de la Direction d'Organisation des Services de Santé (DOSS)**

La réhabilitation de la DOSS est achevée à 81% ce qui correspond à des dépenses de 124.884.25 gourdes sur les 155.000.00 gourdes initialement prévues. Les activités de réhabilitation réalisées n'ont pas été rapportées dans le formulaire d'état d'avancement du projet.

### **2.3.6 Réhabilitation de l'Hôpital La Providence des Gonaïves**

L'objectif principal de ce projet est le renforcement des infrastructures sanitaires de l'Hôpital avec les volets suivants :

- Réhabilitation du Bloc opératoire.
- Adoquinage de la section de chirurgie de l'hôpital.
- Réhabilitation des autres services de l'hôpital.

Ce projet a été exécuté à 58% à des activités envisagées alors que 55% des fonds ont été utilisés, soit 2.169.089.00 de gourdes sur les 4.796.263.00 de gourdes décaissées.

### **2.3.7 Amélioration de la Situation Sanitaire de l'hôpital d'Université d'Etat d'Haïti (HUEH)**

Ce projet a permis les réalisations suivantes :

1. L'Installation d'un système d'eau potable ;
2. Réhabilitation et agrandissement du bâtiment de la dialyse ;
3. Réhabilitation du réseau électrique et installation d'une mini centrale électrique ;
4. Réhabilitation du laboratoire Médical ;
5. Réhabilitation partielle du service d'anapathologie ;
6. Réhabilitation de la résidence des médecins et internes ;
7. Sécurisation de l'hôpital ;
8. Construction d'un entrepôt ;
9. Réhabilitation de la maternité ;
10. Réaménagement du service de Chirurgie ;
11. Réaménagement du service de Pédiatrie ;
12. Réhabilitation de la morgue/Autopsie ;
13. Réhabilitation du service d'urgence ;
14. Réhabilitation du système de climatisation ;
15. Installation Logiciel V 7-0 ;
16. Réaménagement du service Orthopédie ;

L'ensemble de ces activités a été exécuté à 51% et a donné lieu à des dépenses se chiffrant à 4,114.963.70 gourdes, soit 28% des 8,000.000.00 gourdes décaissées.

### **2.3.8 Aménagement des bureaux situés dans l'espace de l'hôpital Militaire**

La réalisation du projet se fera à partir des activités suivantes :

- Aménagement des bureaux de l'hôpital la Paix.
- Aménagement des bureaux de la Direction de la Santé Familiale (DSF) et la Sécurité Transfusionnelle (ST).
- Aménagement d'un bureau pour la Banque Interaméricaine de Développement (BID).

Ces activités n'ont pas encore été exécutées, bien que 61% soit 257.444.04 gourdes des fonds décaissés aient été utilisés sans aucune raison explication fournie par les responsables du sous-programme Infrastructures Sanitaires.

### **2.3.9 Réhabilitation et Mise en Œuvre du Garage Central**

Il était prévu de réhabiliter et de faire fonctionner le garage central à la Cité Militaire, cependant. Bien que ce projet ait pris fin selon les informations recueillies de la part des responsables du Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP), il semble que seule une réhabilitation partielle et la mise en fonctionnement du garage central ont été réalisées pour un montant de 1,748.270.00 gourdes, soit 76.8% des 2,274.435.00 gourdes allouées.

### **2.3.10 Réhabilitation et Agrandissement de l'hôpital Georges Gauvin de Grand Goâve**

Les activités prévues sont les suivantes :

- Etude technique de la réhabilitation et de l'Agrandissement de l'hôpital.
- Réhabilitation de l'ancien bâtiment.
- Construction d'un nouveau bâtiment.
- Réaménagement de la cour de l'hôpital.

Ces activités ont été exécutées à 33 % engageant des dépenses de l'ordre 4,516.411.00 de gourdes, soit 39.9% des 13,301.513.00 gourdes allouées.

### **2.3.11 Réhabilitation de l'Ecole des Infirmières**

Un montant de 3,000.000.00 de gourdes a été prévu, mais celui-ci n'avait pas encore démarré au moment de la préparation de ce rapport. Aucune information n'est disponible sur les raisons qui sont à la base de ce retard.

### **2.3.12 Construction d'un centre d'Oncologique**

Des études sont en cours en vue de la construction du centre. Elle ont nécessité l'utilisation de 35 % des ressources financières disponibles soit 1,054.257.00 gourdes.

### **2.3.13 Réhabilitation et agrandissement de l'hôpital de Ouanaminthe**

Le projet n'a pas encore démarré de façon effective. Des études sont en cours pour lesquelles des dépenses de l'ordre de 545.000.00 gdes ont été effectuées.

### **2.3.14 Réhabilitation de la Direction Départementale des Ressources Humaines (DDRH)**

La réhabilitation de la Direction Départementale des Ressources Humaines (DDRH) est réalisée à 100% avec la totalité des ressources financières décaissée, soit 1.139.500.00 de gourdes.

### **2.3.15 Achèvement des travaux de l'Hôpital Eliazar Germain à Pétion ville**

Il était prévu de reconstruire l'hôpital, ce qui a été effectué à 100% avec tous les fonds disponibles soit 1,826.795.38 gdes.

### **2.3.16 Réhabilitation de l'hôpital justinien au Cap- Haïtien**

La réhabilitation de l'Hôpital Justinien au Cap Haïtien consistait en :

- La réhabilitation des soins intensifs
  
- La Réhabilitation des soins de cardiologie

Ces activités ont été menées à leur terme. 470.973.00 gourdes ont été décaissés à cette fin.

### **2.3.17 Programme de Sécurisation des hôpitaux de l'aire Métropolitaine de Port-au-Prince**

Le renforcement de la sécurité des hôpitaux a été finalisé avec l'emploi de tous les fonds décaissés pour ce projet, soit 6.3790.161.54 de goures. Les activités entreprises pour la sécurisation de ces hôpitaux n'ont pas été rapportées par les responsables du Ministère.

### **2.3.18 Réhabilitation de l'Hôpital de Fort Liberté (CDS)**

Pour ce projet, les partenaires étaient l'USAID et l'ACDI qui ont contribué à l'achèvement des activités prévues pour un montant de 2,000.000.00 de gourdes.

### **2.3.19 Réhabilitation partielle du Centre de Psychiatrie**

Il s'agissait de réhabiliter en partie le centre de Psychiatrie en effectuant le nettoyage du bâtiment. A cet effet, 42.085.00 gourdes ont été utilisées. Aucune information n'est disponible sur les activités exécutées.

### **2.3.20 Projet de Relance Economique en faveur des Personnes Vivant avec le Virus Immunodéficitaire Humaine (PVVIH)**

Aucune information n'a été fournie sur les activités réalisées en faveur des PVVIH alors que des dépenses de l'ordre de 489.700.00 gourdes, soit 25% des 1,958.800.00 gdes allouées.

### **2.3.21 Travaux d'entretien au Centre Haïtiano Arabe Plan International (CHAPI) à Cité Soleil**

Ce projet qui se donne pour objectif le renforcement des structures sanitaires n'a pas encore démarré. Les fonds disponibles s'élèvent à 1,000.000.00 gdes.

### **2.3.22 Sécurisation du Centre Hospitalier de Sainte Catherine Labouré (CHOSCAL) à Cité Soleil**

Ce projet dont la principale activité est le renforcement des structures sanitaires n'a pas encore débuté. Les fonds disponibles sont de l'ordre de 1,200.000.00 de gourdes.

## **2.4- APPUI AUX INITIATIVES DE DEVELOPPEMENT LOCAL**

L'exécution de ce sous-programme est à la charge du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE). Le Ministère de l'Economie et des Finances à travers le Programme de Relance Economique (PROREC) a décaissé un montant de 10,000.000.00 gourdes en faveur des projets de ce Sous Programme. Toutefois, le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE) n'a pas encore soumis les pièces justificatives des dépenses effectuées de l'ordre de 5,526.000.00 gourdes, soit 55.2% des 10,000.000.00 de gourdes allouées à ce sous-programme. De plus, la Coordination Générale du PROREC n'a reçu d'informations que sur l'avancement financier des projets dont :

### **2.4.1 Implantation de moulin à canne à sucre à Pignon (Nord)**

Au niveau de ce projet, il était prévu les activités suivantes :

- Acquisition de deux (2) moulins à canne.
- Acquisition de deux (2) moteurs.
- Acquisition d'accessoires pour les moulins et les moteurs.
- Installation des moulins et des moteurs.
- Construction et montage de Huit (8) chaudières (bouilloires) de grande capacité.
- Construction de deux (2) hangars pour les moulins à canne.
- Construction de deux (2) hangars pour les chaudières.
- Construction de deux (2) toilettes.
- Construction de deux (2) maisons et d'un dépôt incluant u abri pour les moteurs.

Toutes ces activités ont été réalisées et finalisées avec l'utilisation des 2,640.000.00 gdes décaissées à cette fin.

#### **2.4.2 Implantation d'un moulin à manioc à Ouanaminthe (Nord-Est)**

Pour ce projet, seulement 618.000.00 gourdes ont été dépensées, soit 82% des 725.000.00 gourdes décaissées selon le rapport provisoire transmis à la Coordination Générale du PROREC sans qu'aucune information ne soit disponible sur le niveau de réalisation des activités.

#### **2.4.3 Appui à l'élevage avin à Bassin Bleu (Nord-Ouest)**

Aucune ressource financière n'a été utilisée sur les 1,101.500.00 gourdes allouées ni aucune information n'est disponible sur le niveau de réalisation des activités.

#### **2.4.4 Appui à la production d'igname (Nord-Ouest)**

Dans le cadre de ce projet dont aucune information n'est disponible sur le niveau de réalisation des activités. 853.000.00 gourdes, soit 69.9% des fonds ont été utilisées sur les 1,219.500.00 gourdes allouées.

#### **2.4.5 Appui à la production de poissons et à la pêche à Péligre (Artibonite)**

Ce projet envisageait d'exécuter les actions suivantes :

- Etat des lieux et prise de contact.
- Choix du personnel et acquisition de matériels didactiques.
- Acquisition et transport d'autres matériels.
- Formation de 103 pêcheurs.
- Ensemencement du lac (Péligre).
- Rapport final

De ces actions, seulement 77% ont pu être réalisées avec 60% des fonds soit 360.000 gdes des 600.000.00 gdes allouées au projet.

#### **2.4.6 Implantation d'une cassaverie à Gressier (Ouest)**

Les diverses activités prévues dans le cadre de ce projet peuvent se résumer comme suit :

- Construction d'un hangar de 120m<sup>2</sup>.
- Acquisition et installation d'équipements adéquats (moulin, moteur, accessoires, etc.).
- Formation des bénéficiaires.
- Rapport Final.

80% de ces activités ont été exécutées. Des dépenses de l'ordre de 1,055.000.00 gourdes ont effectuées sur les 1,500.000.00 gourdes décaissées à cette fin.

#### **2.4.7 Appui à la production de sel marin à Jacquezi (Nord-Est)**


Ce projet a pu effectuer des dépenses de l'ordre de 618.000.00 gourdes, soit 85.2% des 725.000.00 gourdes décaissées. Aucune information n'est disponible sur le niveau de réalisation des activités.

## 2.5- APPUI AU RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL DU MPCE


Ce Sous-programme est aussi à la charge du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE) et consiste à renforcer les Directions Techniques Centrales et les Directions Départementales à travers un certain nombre de projets.

Des prévisions budgétaires de 45.000.000.00 de gourdes étaient prévues pour l'année fiscale 2004-2005 desquelles 33.300.500 de gourdes ont été virées au compte d'investissement du Ministère de la Planification. De ce montant 28.059.173 de gourdes ont été dépensées, soit 84.2%.

L'état d'avancement de ce sous-programme peut être observé dans le graphique suivant qui montre que les activités ont été réalisées à 56% tandis que l'avancement financier a atteint 73%.

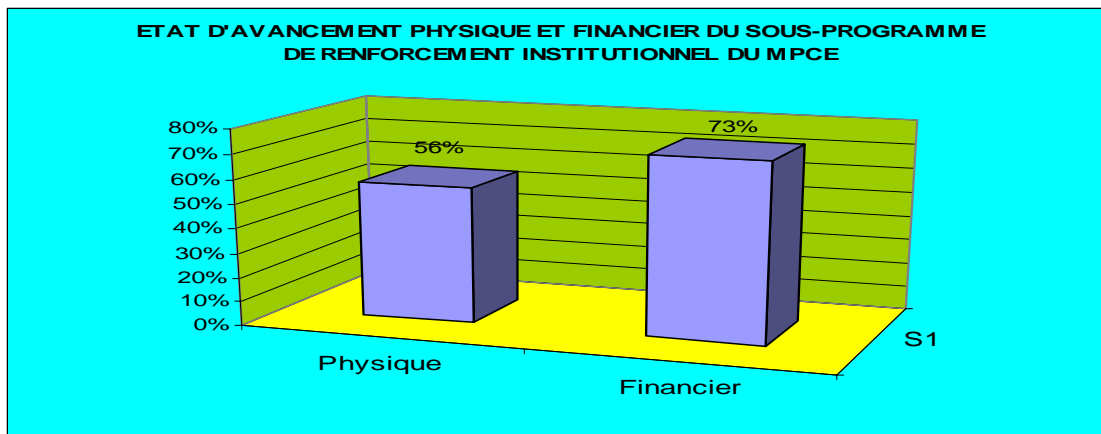

Une comparaison des résultats obtenus au 30 juillet 2005 (Rapport d'Etape No 2) avec ceux obtenus au 30 septembre 2005 montre une progression de 13% des résultats obtenus comme le montre le graphique suivant. En effet les résultats atteints sont passés de 43% en juillet à 56% en septembre.

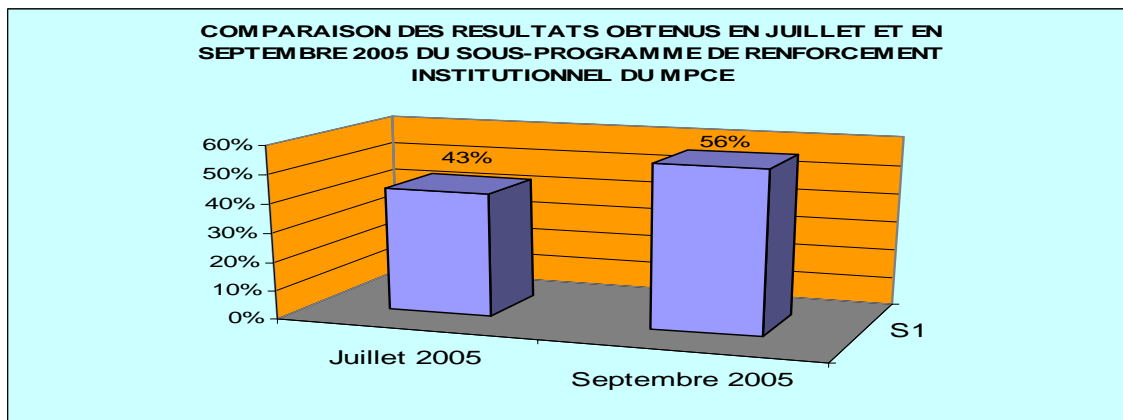

Les projets concernés sont les suivants :

### **2.5.1 Le renforcement du Système National de Planification**

Ce projet envisage les actions suivantes :

- Elaboration d'un document cadre décrivant le Nouveau Système National de planification globale et régionale dans ses composantes : globale, sectorielle, spatiale, régionale et locale.
- Cadre de référence relatif à l'élaboration du Nouveau Système National de Planification.
- Engagement d'un expert pour l'étude du Nouveau Système national de Planification (NSNP).
- Rapport de suivi et d'évaluation du processus d'élaboration.

De ces actions, 45% furent exécutées avec des dépenses de l'ordre de 1,210.000.00 gourdes sur les 1,800.000.00 gdes décaissées, soit 67.2% des fonds.

### **2.5.2 L'Appui à la planification Globale**

Le projet d'appui à la Planification Globale envisageait de réaliser :

- Un schéma logique de fonctionnement.
- Un modèle économétrique capable de faire des prévisions sur la planification.
- Une banque de données économiques.
- Un renforcement de la capacité technique de la Direction de la Programmation Economique et Sociale (DPES).

Ces activités ont été réalisées à hauteur de 57% avec l'emploi de 1,200.000.00 gourdes, soit 75% des 1,600.000.00 gdes décaissées.

### **2.5.3 Appui à l'élaboration du document de stratégie de réduction de la Pauvreté (DSRP)**

Les objectifs principaux de ce projet étaient de :

- Sensibiliser et motiver les instances gouvernementales et de société civile autour du DSRP.
- Formuler de façon claire et nette une stratégie de lutte contre la pauvreté.
- Publication du document du DSRP

50% de ces objectifs ont été atteints pour des dépenses de l'ordre de 2,304.555.11 gourdes sur les 2,699.500 gdes décaissées, soit 85.3% des fonds.

### **2.5.4 Appui à l'aménagement du Territoire, au Développement Global et Régional**

Dans le cadre de ce projet, il était prévu de :

- Définir un cadre global de la Politique Nationale d'Aménagement du Territoire.
- Elaborer un projet de loi relatif à la Politique Nationale d'Aménagement du Territoire.
- Restructurer les sections communales.

- Elaborer un projet de loi et un plan de zonage.
- Elaborer une base de données géoéconomiques.
- Réaménager et équiper le local de l'Unité d'Aménagement du Territoire.

40% de ces activités ont été exécutées avec l'emploi de 1,763.789.00 gourdes sur les 4,100.000.00 gourdes prévues, soit 18.7% des fonds.

### **2.5.5 Montage d'un système d'information**

La réalisation de ce projet vise les objectifs suivants :

- Une interconnexion de l'ensemble des sous-systèmes d'information du MPCE.
- Réalisation d'un sous-système d'Information sur l'investissement public (secteurs, ONG, MPCE, etc.).
- Création d'une base de données Géoéconomiques.
- Renforcement de la capacité de gestion de l'Unité de Documentation et d'Informatique (UDI).

De ces actions, 50% ont été effectuées pour des dépenses de 1,657.000.00 gourdes, soit 77% des 2,150.000.00 gourdes décaissées.

### **2.5.6 Promotion de Projets**

La promotion de projets dans le cadre de l'Appui au renforcement Institutionnel du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE), envisageait les activités suivantes :

- La conceptualisation d'un système d'information sur les programmes et projets.
- La définition d'un outil indispensable à la gestion du cycle d'alimentation du Programme d'Investissement public (PIP).
- Le renforcement de la capacité technique de l'Unité de Pré-Investissement (UPI).
- La création d'une banque de projets.

Ces diverses activités ont été exécutées à 50% des prévisions avec l'utilisation de 68% des fonds alloués soit 1,899.400.00 gourdes des 2,800.000.00 de gourdes décaissées.

### **2.5.7 Appui au renforcement de la capacité institutionnelle de l'Unité de Coordination des Activités des Organisations Non Gouvernementales (UCAONG)**

Dans le cadre de ce projet, il était prévu de :

- Mettre en place d'un mécanisme de contrôle et de suivi des activités des Organisations Non Gouvernementales (ONG).
- Mettre en œuvre un système d'information sur les ONGs.

De ces actions, 56% ont été exécutées pour des dépenses de l'ordre de 888.500.00 de gourdes, soit 87% des 1,020.500.00 gourdes allouées au projet

### **2.5.8 Renforcement de la Direction de Coopération Externe**

Le renforcement de la Coopération Externe vise à :

- L'Elaboration d'une politique de coopération.
- Au Renforcement de la capacité opérationnelle de la DCE.
- Au Renforcement de la structure de la DCE en matière de ressources humaines et matérielles.
- L'Opérationnalisation d'une base de données sur la politique de l'aide pour le développement.

54% de ces actions ont été réalisées pour des dépenses de l'ordre de 998.896.00 gourdes, soit 71.3% des 1,400.500.00 gdes décaissées.

### **2.5.9 Renforcement des mécanismes de coordination du MPCE**

La mise en œuvre de ce projet permettrait :

- Le réaménagement des structures centrales.
- L'équipement de l'ensemble des locaux du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE).

Le Ministère de la Planification a alloué 9,186.035.00 gourdes pour exécuter ce projet qui a réalisé 69% des objectifs avec des dépenses de l'ordre de 1,831.707.00 gourdes, soit 19%.

### **2.5.10 Appui aux Directions Départementales**

Aucune information n'a été reçue à ce jour sur les diverses actions envisagées au niveau de ce projet. On peut seulement mentionner que les dépenses effectuées s'élèvent à 10,070.180.00 de gourdes, soit 64.7% des 15,562.775.00 gdes allouées.

### **2.5.11 Appui à la gestion du Programme d'Investissement Public (PIP)**

L'appui à la gestion du Programme d'Investissement Public implique les actions suivantes :

- L'élaboration et la vulgarisation d'un cadre normatif du système d'évaluation, de contrôle et de suivi de l'exécution des projets du PIP.
- Le Renforcement de la structure de la Direction Evaluation et Contrôle (DEC) en matière de ressources humaines et matérielles.

90% des actions envisagées dans le cadre de ce projet ont été réalisées avec l'utilisation de 4,235.146.00 gourdes, soit 170% des 2,490.000.00 gdes.

Cependant, pour combler l'écart entre les montants dépensés et ceux initialement prévus, le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE) a dû effectuer le virement d'un montant de 1,489.000.00 gourdes de l'allocation prévue pour certains projets du sous-programme d'Appui aux Initiatives de Développement Local. Cela explique le surplus de dépenses par rapport aux décaissements identifiés au niveau du projet d'Appui à la gestion du Programme d'Investissement Public (PIP).

Dans l'ensemble, le sous-programme n' a pu réaliser que 51% des activités prévues accusant des écarts qui s'expliquent en raison:

- Des retards de décaissement des ressources financières.
- Des problèmes d'insécurité à Port-au-Prince qui ont influé sur le fonctionnement et la productivité des structures.
- Des retards enregistrés dans le renforcement logistique des structures.

Par ailleurs, ainsi qu'il a été noté pour les projets d'appui aux initiatives de développement local à la charge du même Ministère, aucun rapport sur l'état d'avancement physique et financier respectif des projets listés ci-dessus n'a été transmis à la Coordination Générale du PROREC.

## **2.6-SOUS-PROGRAMME D'INTERVENTIONS SPECIFIQUES**

Ce sous-programme dont l'objectif principal est de contribuer à réduire à court et moyen terme le taux de chômage des jeunes défavorisés envisage de :

- Subventionner des activités à caractère social et génératrices de revenus au bénéfice des jeunes démunis.
- Favoriser la solidarité citoyenne.
- Consolider des actions structurantes en faveur des populations locales.
- Encadrer les étudiants finissants dans des stages pratiques.
- Assister les jeunes chômeurs par des activités d'enquête de terrain.

### **2.6.1 VOLETS**

#### **2.6.1.1 Subventions aux associations et institutions à caractère social**

##### **A. Associations Subventionnées**

Une subvention ne dépassant pas un certain montant en équipements et matériels a été accordée à des associations et/ou Institutions (Publics ou Privées) qui remplissent les conditions préalables suivantes :

- Présentation des statuts et règlements internes de l'Association
- Présentation d'attestation d'enregistrement valide et récente délivrée par le Ministère des Affaires Sociales et du Travail.
- Budget de Fonctionnement pour les deux (2) dernières années et perspectives pour les cinq (5) ans à venir.
- Liste des membres de l'Association avec : Nom et Prénom, NIF, et Occupation.
- Lettre de non-objection de la Mairie de la Commune où l'activité aura lieu.
- Lettre de recommandation de Ministères en fonction de la nature de l'activité.
- Trois (3) pro forma de maison de commerce pour les équipements et matériels et pour le montant convenu et ne dépassant pas un certain seuil nécessaire à la réalisation des activités du projet soumis.

- Rapport des Directions Départementales du Ministère de l'Economie et des Finances sur l'existence, le fonctionnement effectif et la crédibilité de l'Association.

L'analyse approfondie de tous ces documents va déterminer l'éligibilité de l'Association à obtenir une subvention. A ce jour, le PROREC a accordé des subventions à Quinze (15) Associations/Institutions pour un montant de 1,331.909.69 de gourdes. (Voir liste en annexe #1), dont :

### ***1. Ministère des Affaires Sociales et du Travail***

Le Ministère des Affaires Sociales et du Travail a soumis au Programme de Relance Economique (PROREC) un projet de Camp d'Eté en faveur de 700 enfants défavorisés des communes de Delmas et de Carrefour. Le PROREC a subventionné le paiement de vingt (26) moniteurs pour un montant total de 100.000.00 gourdes par chèque individuel à l'ordre des moniteurs, suivant un contrat signé entre le Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST) et les bénéficiaires.

### ***2. Global Realty***

Cette organisation qui existe depuis 2001 intervient dans plusieurs domaines dont la santé, l'éducation, la formation, les Nouvelles Technologies de l'Information et de Communication (NTIC). Le projet soumis au PROREC visait à implanter dans les écoles un programme de promotion de la santé en offrant une assistance médicale aux jeunes et des activités de conférences, journées de santé, etc à l'intention des jeunes au niveau des 10 écoles suivantes membres du programme soit :

- ✓ Lycée Marie Jeanne
- ✓ Lycée Toussaint
- ✓ Lycée du Cent Cinquantenaire
- ✓ Lycée Jacques 1<sup>er</sup>
- ✓ Lycée Firmin
- ✓ Collège Marie-Anne
- ✓ Collège St Louis de Bourdon
- ✓ Collège Jean Price Mars
- ✓ Collège de Jeunes Filles
- ✓ Collège Ernst Désir

Le budget prévu était d'un Million de gourdes (1,000.000.00 gdes). Le Programme de Relance Economique a donc octroyé un montant de Quatre Vingt Neuf Mille Six Cent Soixante Trois Gourdes Cinquante (89.663.50 Gdes) à l'institution Global Realty après analyse des documents sollicités et soumis. Deux chèques couvrant ce montant ont été émis à l'ordre des maisons de commerce dont les noms suivent :

- Hospital & Medical Supplies pour un montant de 58.859.12 gdes pour l'acquisition de :

⇒ Tensiomètres

- ⇒ Thermomètre
  - ⇒ Masque (cache poussière), etc.
- Etablissements Raymond Flambert (ERF) pour un montant 30.804.38 gdes pour l'acquisition de :
- ⇒ Cinq (5) unités de plywood (planches) ordinaires
  - ⇒ Cinq (5) serrures
  - ⇒ Cinq (5) gallons de peinture Bel Enamel
  - ⇒ Cinq (5) gallons de peinture Flatex
  - ⇒ Cinq (5) poignets de porte
  - ⇒ Deux (5) colles menuisier

### ***3. Association des Femmes en Action***

Cette association de femmes évolue au niveau de l'Archahaie et a déjà réalisé des projets en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies sur les Droits de la Femme et l'Organisation des Etats Américains dans le domaine de la formation des femmes. Elle avait proposé un projet d'acquisition de machines à coudre en vue d'établir un atelier de couture. Après étude des documents soumis, le PROREC a subventionné l'acquisition du matériel sollicité soit l'achat de 12 machines à coudre à la Maison de Commerce J.C. ASSALI pour un montant de Cinquante Sept Mille Gourdes (57.000.00 Gdes).

### ***4. Ministère à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme***

Ce Ministère a proposé un projet pilote d'implantation d'un poulailler de pondeuses dans la zone de Cité Soleil au bénéfice de Cinq Cent (500) familles monoparentales c'est-à-dire des mères célibataires. Ce projet sera exécuté en partenariat avec le Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) par la mise en œuvre de micros unités de production d'œufs, capables de générer un revenu net de 1000 à 1500 gourdes par mois. Le coût total du projet était de 316.645.60 dollars américains. Le Programme de Relance Economique a subventionné une partie de la première partie du projet notamment pour l'acquisition des poulets, des cages et de la nourriture. Un paiement a été effectué au bénéfice du Ministère à la condition Féminine et aux Droits de la Femme à l'ordre de la Coopérative de Services à l'Elevage et de Services Vétérinaires de l'Ouest (COSEVO) pour un montant de 99.975.00 Gdes pour l'acquisition de 129 sacs de nourriture pour pondeuses.

### ***5. Institution Mixte Beauvoir***

L'Institution Mixte Beauvoir est une entité à caractère éducatif et social dont l'objectif principal est de former les jeunes défavorisés du pays de manière à les rendre utiles à la communauté et à connaître un certain épanouissement socioculturel. Ainsi, cette institution évoluant depuis près de cinq ans dans la région de Pernier à Pétion-Ville a proposé un projet d'Intégration Juvénile afin de permettre aux jeunes d'acquérir une profession, d'encourager la solidarité, l'entraide, l'amour du prochain, le partage et l'estime de soi à partir d'activités professionnelles (cours d'anglais, cours d'informatique,

couture, crochet, broderie, Art floral), d'éducation civique (droits et devoirs, environnement, maladies sexuellement transmissibles, notion de respect, partage et amour), culturelles (danse, théâtre, sport, musique).

Ce projet devait se réaliser durant les vacances de Juillet à Août mais le processus de vérification sur le terrain du fonctionnement réel et de la crédibilité de l'Institution a été trop lent, ce qui a occasionné un retard dans l'octroi de la subvention de 99.173.72 gourdes en vue de l'acquisition de matériels nécessaires à la réalisation du projet aux maisons de commerce suivants :

- J.C. Assali : 25.000.00 gourdes pour l'acquisition de :
  - ⇒ Cinq (5) machines à coudre à pédale (Singer)
- G & G Sportif : 52.981.25 gourdes pour l'acquisition de :
  - ⇒ Cinq (5) ballons de Foot-Ball
  - ⇒ Cinq (5) ballons de Basket-ball
  - ⇒ Cinquante (50) costumes de sport (culottes et maillots)
- Maison Dupuy : 4.945.00 gourdes pour l'acquisition de :
  - ⇒ Vingt (20) rubans de mesure
  - ⇒ Vingt (20) bobines de fils à coudre
  - ⇒ Deux douzaines Colles
  - ⇒ Une douzaine d'aiguilles et autres matériels de couture
- L'Abeille S.A : 4.653.70 gourdes pour l'acquisition de :
  - ⇒ Deux cent (200) Bristols
  - ⇒ Vingt cinq (25) Duplex, etc..
- Maison Stecher : 8.593.77 gourdes pour l'acquisition de :
  - ⇒ Trois (3) agrafeuses
  - ⇒ Trois (3) rames de papier blanc 8½ x 11
  - ⇒ Cinquante (50) cahiers, etc..

## **6. Association pour le Développement (BERAKA)**

Cette organisation qui travaille dans le domaine du développement depuis 1994 a soumis un projet de construction d'un complexe médico-social dans la zone de Bon repos dans la plaine du Cul-de-Sac c'est-à-dire la mise en place d'un centre offrant des services d'enseignements aux enfants des familles victimes des violences de Cité Soleil et qui ont dû abandonner leurs domiciles pour venir s'installer à Bon repos, et des services médicaux gratuits. Le projet a un coût estimatif de 1,919.515.00 gourdes et est destiné à

bénéficiaire 3000 personnes. Le PROREC a subventionné une partie du matériel demandé par l'acquisition à Univers-Mat pour un montant de 100.000.00 gourdes de :

- ⇒ Deux cent soixante dix (270) sacs de ciment
- ⇒ Sept cent (700) briques 15 x 15
- ⇒ Quatre cent (400) briques 10, etc..

#### **7. Fòk Youn Ede Lòt (FYEL)**

Le projet proposé par l'organisation FYEL consistait dans l'implantation d'un atelier d'ébénisterie à Anse Rouge dans le Département de l'Artibonite pour un montant de 125.000.00 gourdes. La Coordination Générale du PROREC a subventionné l'acquisition de certains matériels sollicités à deux (2) maisons de commerce dont :

- BATIMAT : 33.374.46 gourdes en vue de l'acquisition de :

- ⇒ colle menuisier
- ⇒ tournevis
- ⇒ angle grinder, etc.

- Maison Robert Bonhomme : 66.540.50 gourdes en vue de l'acquisition de :

- ⇒ Marteau
- ⇒ Equerres
- ⇒ Serre points

Cette subvention totalise un montant de 99.914.96 gourdes en fonction des prix des articles mentionnés dans les trois (3) pro forma sollicités et présentés par l'Association.

#### **8. Comité Central des Etudiants de l'Institut National d'Administration de Gestion et des Hautes Etudes Internationales (INAGHEI)**

Certains étudiants de l'Institut National d'Administration de Gestion et des Hautes Etudes Internationales (INAGHEI) regroupés en un comité Central d'Etudiants ont présenté à la Coordination du Programme de Relance Economique un projet d'Excursion Balnéaire sur la Côtes des Arcadins c'est-à-dire une journée récréative offrant une opportunité aux étudiants de se détendre, de se familiariser entre eux, d'échanger des idées sur la vision d'intégration universitaire à l'INAGHEI, de réaliser des débats sur l'Aménagement du littoral dans le cadre du développement du tourisme. Le projet sollicitait une subvention de 50.077.50 gourdes. Le Programme de Relance Economique a subventionné cette activité à concurrence de 50.000.00 gourdes à travers le Décanat de l'INAGHEI.

#### **9. Atelier d'Ebénisterie des Professionnels Salésiens (AEPS)**

L'atelier d'ébénisterie des professionnels Salésiens (AEPS) a été fondé le 1<sup>er</sup> Mai 2003 à Martissant. Son objectif principal est de contribuer à réduire le chômage et d'augmenter

la production nationale en vue de l'amélioration de la condition socio-économique de ses membres. Cette association de professionnels en ébénisterie a déposé au PROREC un projet de renforcement de l'atelier. Après analyse des dossiers de cette association, le PROREC a octroyé une subvention de 99.466.58 gourdes pour l'acquisition à la maison de commerce General Distributor hardware du matériel suivant:

- Ciseau bois
- Pierre à l'huile
- Scie Egoïne, etc.

#### ***10. Société de création d'activités et de développement National (SOCRADENA)***

Cette association qui existe de puis le 12 Mars 2005 à Carrefour se propose de réduire le taux de chômage dans cette localité et de permettre à la population de réaliser une activité économique rentable. C'est dans ce cadre qu'un projet de fabrication de briques a été soumis au PROREC. L'étude des documents a permis d'accorder à cette association une subvention de 99.250.00 gourdes en équipement et matériel qui a été utilisée pour l'acquisition de matériels aux maisons de commerce suivants :

- ETG S.A : 14.335.20 gourdes
  - ⇒ Brouettes
  - ⇒ Pelle ronde, etc.
- Franck Machine : 45.000.00 gourdes
  - ⇒ Moule pour machine simple (bloc 10)
  - ⇒ Moule pour machine simple (bloc 15)
  - ⇒ Moule pour machine simple (bloc 20)
  - ⇒ Machine pour clostrat (5)
  - ⇒ Machine pour dormante (4)
- La Concorde Nestor & Co : 19.750.00 gourdes
  - ⇒ 50 sacs de ciment
  - ⇒ 17m<sup>3</sup> de sable moulu

#### ***11. Fondation Lefort Petit de Fond Droit (FOLEP)***

Cette fondation a soumis à la coordination du PROREC un projet d'ouverture d'un salon de coiffure à Fond Droit (Léogâne) dont les bénéficiaires seront les jeunes sans avenir de la zone. La fondation Lefort Petit de Fond Droit qui existe depuis le 4 Septembre 2003 et se donne comme objectif de travailler à l'amélioration des conditions de vie des jeunes défavorisés de Fond Droit 10<sup>ème</sup> Section Communale de Léogâne. L'analyse du dossier déposé a révélé l'existence effective de la fondation et a permis de constater que plusieurs actions avaient déjà été réalisées dans la zone de Fond Droit. Une subvention d'un montant de 85.638.00 gourdes lui a été accordée en vue de l'acquisition d'équipement et

de matériel nécessaire à la concrétisation du projet dans les maisons de commerce suivants :

- Fouad A. Mourra : 27.600 gourdes
  - ⇒ Tondeuses
  - ⇒ Poudre de talc
  - ⇒ Bléau
  
- Valerio Canez : 58.038.00 gourdes
  - ⇒ Génératrice gazoline
  - ⇒ Deux (2) ind. Wall fan

### ***12. Ecole Béthanie Soir***

Cette école se trouve à la Petite Rivière de l'Artibonite et ses responsables avaient formulé une demande de subvention au profit des enfants en domesticité de la zone à l'occasion de l'ouverture des classes. Après analyse des différents documents, la Coordination du PROREC a accepté de subventionner l'acquisition de fournitures scolaires pour un montant de 99.679.38 gourdes par le truchement des maisons de commerce suivants :

- J.C. ASSALI : 53.700.00 gourdes ; 612 aunes de tissus.
- Maison Deschamps : 45.979.00 gourdes : cahiers, livres et autres fournitures scolaires.

### ***13. Comité de Gestion de Propriété Village Plus (CGPVP)***

Cette organisation avait soumis un projet d'ouverture d'un atelier de couture au profit des jeunes incapables de continuer avec leurs études classiques. Le Comité de Gestion de Propriété Village Plus (CGPVP) existe depuis quinze années et a déjà réalisé plusieurs activités dans le village situé au Boulevard Harry Truman à Port-au-Prince comme :

- a. Implantation d'une école communautaire
- b. Création d'une clinique communautaire
- c. Electrification du village en 2003
- d. Implantation d'une fontaine d'eau potable en 1992
- e. Création d'une caisse populaire en 2004

Aussi, la coordination du PROREC a octroyé une subvention de 66.361.00 gdes à l'ordre des maisons de commerce :

- Maison Dupuy pour 21.736.00 gdes pour l'acquisition de :
  - ⇒ Ciseaux
  - ⇒ Centimètres

- ⇒ Boîtes de fil à coudre
  - ⇒ Roulettes en bois
  - ⇒ Aunes pellons
  - ⇒ Etc.
- Kay Trace Master pour 44.625.00 pour l'acquisition de sept (7) machines à coudre.

#### ***14. Fédération des Organisations de Carrefour Feuille (FOCAF)***

La FOCAF a été fondée en 1998 à Carrefour-Feuilles et sa mission est de contribuer au développement de la zone de Carrefour Feuilles. Cette fédération a déposé au PROREC un projet d'atelier d'ébénisterie au bénéfice de certains membres de la fédération qui sont des ébénistes. Le coût total du projet s'élevait à 113.200.00 gourdes. La Coordination Générale du PROREC après analyse des documents soumis a subventionné l'acquisition de matériels pour un montant de 85.817.55 gourdes à la maison de commerce : GENERAL DISTRIBUTOR HARDWARE. Ces matériels sont les suivants :

- 1 Grinder Bosh
- 1 Scie à Métaux Stanley
- 2 marteaux 1 hammer drill
- 14 grattoirs à main

#### ***15. Organisation des Frères Unis en Christ (OFUCH)***

L'organisation des Frères Unis en Christ est fondée en Novembre 2004 par un groupe de chrétiens et son objectif principal est la promotion des droits des citoyens. Elle a soumis à la Coordination Générale du PROREC un projet de création d'une cantine en faveur des enfants défavorisés de la zone de la Croix des Bouquets pour un montant de 100.000.00 gourdes. Après analyse du dossier, le PROREC a subventionné à hauteur de 99.970.00 gourdes l'acquisition de riz, pois, maïs, pâtes alimentaires (spaghetti, macaroni, etc) etc.à la maison de commerce Secours de l'Eternel Dépôt.

### **B. Associations non subventionnées**

On voudra bien noter que certaines associations qui ont pu déposer tous les documents sollicités (Attestation de fonctionnement du Ministère des Affaires Sociales, budget de fonctionnement, réalisation à date, etc.), n'ont pas été subventionnées pour autant, Et cela en raison d'enquêtes de terrain effectuées par les Directions Départementales du Ministère de l'Economie et des Finances qui ont fait état soit d'usurpation de titres et/ou d'utilisation de faux documents, soit de l'inexistence des l'associations en question dans les zones qu'elles prétendent aider, soit de l'absence de structures organisationnelles ou soit encore de leur manque de crédibilité dans leur zone d'implantation. (Voir liste en annexe # 2)

### **C. Dossiers à l'étude**

Pour le moment, la Coordination Générale du Programme de Relance Economique (PROREC) est en train d'analyser les dossiers de 112 associations pour des demandes de subventions. (Voir liste en annexe # 3).

### **D Associations non éligibles**

A côté des groupes et/ou associations mentionnés antérieurement, il en existe d'autres dont les projets n'ont pas été retenus simplement parce qu'elles ne présentaient pas des projets à caractère social au bénéfice de groupes de jeunes démunis. (Voir liste en annexe # 4)

#### ***2.6.1.2 Promotion de l'Emploi Productif***

Ce volet concerne certaines entreprises et /ou groupes de personnes réunies en association qui ont soumis des projets présentant un caractère de création d'emplois à moyen terme mais dont les promoteurs n'ont pas les moyens financiers nécessaires. Le Programme de Relance Economique (PROREC) à travers le Ministère du Commerce et de l'Industrie compte encadrer les entreprises et/ou groupes de personnes ayant sollicité un appui pour leurs projets respectifs en leur donnant accès à un fonds de soutien qui sera géré par le Fonds de Développement Industriel (FDI). (Voir liste en annexe # 5)

Selon le dernier rapport du Coordonnateur sectoriel du PROREC au Ministère du Commerce et de l'Industrie, les dossiers reçus de la Coordination Générale ont été analysés en fonction des critères généraux d'éligibilité retenus à savoir :

- Appartenance de l'entreprise au secteur productif
- Capacité de générer des emplois immédiats

Ainsi, les dossiers ont été classés en deux (2) catégories :

#### **A. Catégorie I : Entreprises ou Groupes non éligibles**

Parmi les entreprises candidates, huit (8) d'entre elles n'ont pas soumis de projets répondant aux critères généraux d'éligibilité retenus par le PROREC. Ces huit (8) entreprises ou Groupes sont :

- MYAGGY KREDI PAM
- Ecole Professionnelle LCM CYBER CAFE
- H et G Construction
- Ronet et Solange Store
- Amical Dépôt Boissons Gazeuses
- CYBER CAFE TOUCHNET
- Alliance pour le Développement de Maïs Gâté
- HAITI CULTURE MAGASINE

### **1. MYAGGY KREDI PAM**

C'est une entreprise commerciale fondée à Carrefour en Juillet 1998 et qui se consacre au crédit en faveur des petits commerçants. Ainsi, elle a sollicité du PROREC un financement de 450.000.00 gdes pour l'augmentation de sa capacité de prêts.

### **2. Ecole Professionnelle LCM CYBER CAFE**

Cette entreprise a été vandalisée au cours des évènements du 17 Novembre 2001 et souhaitant relancer l'entreprise, les responsables ont fait une demande de 5.580.00 US\$ à la Coordination Générale du PROREC.

### **3. H et G Construction**

Les responsables de cette affaire commerciale ont décidé d'ouvrir une entreprise de matériaux de construction dans la zone de Caradeux et ont sollicité du PROREC un financement de 1,387.650.82 gourdes.

### **4. Ronet et Solange Store**

Les responsables de cette entreprise, ont sollicité du PROREC un financement de 2,000.000.00 gourdes pour l'extension de l'entreprise Ronet et Solange Store qui se consacre dans la vente de produits Alimentaires.

### **5. Amical Dépôt Boissons Gazeuses**

La Coordination Générale du PROREC a reçu un projet d'ouverture d'un dépôt de vente de boissons gazeuses pour un montant de 92.450.00 gourdes des responsables de Amical Dépôt Boissons Gazeuses.

### **6. CYBER CAFE TOUCHNET**

C'est un projet d'ouverture d'un cyber café pour un montant de 1.000.00 US\$.

### **7. Alliance pour le Développement de Maïs Gâté**

L'Alliance pour le Développement de Maïs Gâté a déposé au PROREC un projet d'implantation d'un restaurant communautaire et a sollicité un prêt de 100.000.00 Gourdes.

### **8. HAITI CULTURE MAGASINE**

Un financement de 837.870.00 gourdes a été sollicité pour la création de l'entreprise HAITI CULTURE MAGASINE qui se consacrera à la production et la publication d'un magazine dénommé : Haïti Culture Magasine.

## **B Catégorie II : Entreprises éligibles**

Onze (11) entreprises ont soumis des projets qui répondent aux critères et sont donc éligibles pour bénéficier du fonds de soutien et d'encadrement du Fonds de Développement Industriel (FDI) à travers le PROREC. Ce sont :

### **1. *NATURICIN***

L'entreprise NATURICIN se spécialise dans la production de l'huile de ricin. Aussi, voulant augmenter sa capacité de production, les responsables ont sollicité du PROREC un fonds de 20.165.00 US\$.

### **2. *Topla Entreprise de production de Mamba, confitures et gelée***

L'Association des Paysans de Vallue a créé en 1997 l'entreprise TOPLA grâce au support financier de l'USAID et de l'Organisation Save the Children. Cette entreprise se consacre à la production de mamba, de confiture et de gelée. Désirant augmenter sa production, l'Association des Paysans des Value a sollicité du PROREC un financement de 1,500.000.00 gourdes.

### **3. *Men kontre Boulangerie***

Deux (2) professionnels ont décidé de se réunir pour créer une boulangerie dénommée : Men kontre boulangerie dans la zone de Carrefour et ont sollicité du PROREC un financement de 1,263.625.00 gourdes.

### **4. *FINESSE ARTS***

Cette entreprise a sollicité du PROREC un financement de 8,707.060 de gourdes pour le renforcement de son atelier d'artisanat.

### **5. *Entreprise d'Aménagement de Terrains et de Travaux S.A (EATT)***

Cette entreprise oeuvrant dans la construction d'infrastructures publiques et de bâtiments (routes, assainissement urbain, irrigation et drainage agricole, système d'adduction d'eau potable, etc.) a sollicité du PROREC un financement de 2,600.000.00 de gourdes dont 1,350.000.00 gourdes pour consolider ses dettes bancaires et 1,250.000.00 de gourdes pouvant servir de garantie bancaire pour les cautions et les avances de démarrage.

### **6. *Société Haïtienne d'Agro-industrie S.A***

Les Ministères de l'Agriculture et du Commerce ont transmis au PROREC un projet de relance de la production de tomate dans l'Artibonite qui serait exécuté en association avec la Société Haïtienne d'Agro-industrie S.A pour un montant de 26.000.000.00 de gourdes.

## ***7. Groupe de Recherche et d'Action pour le Développement Economique et Social (GRADES)***

Ce groupe a déposé au PROREC un projet de modernisation des exploitations agricoles dans la région Nord. Ce projet vise à établir un réseau d'entreprises agricoles modernes n'utilisant pas les outils aratoires et relié à un circuit de commercialisation des produits agricoles récoltés et a un coût estimatif de 69.361.490.00 de gourdes.

## ***8. Réseau des Ateliers du Fer***

Ce réseau a soumis à la Coordination Générale du PROREC un projet de création de trois (3) ateliers de ferronnerie dans la région du Nord. Ces ateliers seraient spécialisés dans la fabrication d'équipements agricoles : Charrues à traction animale, herse, semoirs, etc. Ce projet a sollicité un financement de l'ordre de 473.527 US\$

## ***9. Young Life Haïti***

C'est une association de jeunes oeuvrant dans les domaines éducatifs et culturels. Elle a sollicité du PROREC un financement de 3.015.000.00 de gourdes pour l'exécution d'un projet de production de bananes.

Par ailleurs, deux (2) autres entreprises ont soumis des projets qui en dépit du fait qu'ils ne répondent pas tout à fait aux critères, sont éligibles, étant donné le degré d'implantation de ces entreprises dans leur milieu et l'importance du type de services qu'elles offrent à la population. Ce sont :

## ***10. INFO EXPRESS***

INFO EXPRESS est une école informatique et les responsables ont soumis au PROREC un projet de restructuration d'une école informatique communautaire dans la zone de Ganthier pour un montant de 1,900.000.00 gourdes.

## ***11. New Format Multi Services***

Un financement de 379.525.00 de gourdes a été sollicité au PROREC pour l'ouverture de l'entreprise New Format Multi Services spécialisée dans le traitement de texte (CV, Devoir, Mémoire et projets de sortie, cartes de visites, etc.), travaux d'imprimerie (carnets scolaires, recueil de poèmes, etc).

La Coordination Générale du PROREC souhaite que le Fonds de Développement Industriel, partenaire du Sous-Programme d'Appui aux Initiatives Privées dudit programme, puisse réagir très rapidement pour fournir l'encadrement technique et le soutien financier nécessaires à ces entreprises éligibles en vue de finaliser leur dossier.

### ***2.6.1.3 Soutien aux jeunes chômeurs***

En vue de contribuer à la réduction du chômage des jeunes pendant les vacances d'été, le Programme de Relance Economique a mis en œuvre un volet d'appui aux jeunes

chômeurs âgés de 21 à 30 ans. Ce volet d'activités est sous la responsabilité directe de la Coordination Générale du PROREC, exécutée par des responsables communaux, superviseurs, enquêteurs et guides recrutés par les Directions Départementales du Ministère de l'Economie et des Finances et supervisée techniquement par l'Institut Haïtien de Statistique et d'Informatique (IHSI).

Il s'agit de la réalisation d'enquêtes de terrain pour la mise à jour des informations sur les ressources et potentialités des communes (Fichier Communal). Le résultat de cette activité permettra aux nouveaux maires élus lors des prochaines élections d'avoir des données à jour sur leurs communes respectives.

La Coordination Générale du PROREC et les Directions Départementales du Ministère de l'Economie et des Finances étaient chargées de faire la sélection, le recrutement et la supervision administrative des agents enquêteurs, guides, superviseurs et responsables communaux, ainsi que d'assurer le paiement du personnel engagé sur la base des critères suivants :

#### 1. Responsables communaux

- Niveau universitaire
- Expérience dans les opérations d'enquête
- Attestation de résidence dans la commune d'origine
- Carte d'identité fiscale valide pour l'exercice 2005-2005

#### 2. Superviseurs

- Baccalauréat Deuxième partie
- Expérience dans les opérations d'enquête
- Attestation de résidence dans la commune d'origine
- Carte d'identité fiscale valide pour l'exercice 2005-2005

#### 3. Enquêteurs

- Neuvième année Fondamentale
- Expérience dans les opérations d'enquête
- Attestation de résidence dans la commune d'origine
- Carte d'identité fiscale valide pour l'exercice 2005-2005


#### 4. Guides

- Sixième année Fondamentale
- Expérience dans les opérations d'enquête
- Attestation de résidence dans la commune d'origine
- Carte d'identité fiscale valide pour l'exercice 2005-2005


Cette activité a démarré au début du mois d'août et est à 80 % terminée. A date, un montant de 19.059.500.00 de gourdes a déjà été décaissé pour couvrir les frais de

recrutement, de formation, de transport, de supervision, d'acquisition de matériels et d'indemnités du personnel recruté qui s'élève à 3,300 jeunes.

Le graphique suivant montre la répartition du personnel d'exécution dans les dix (10) départements géographiques du pays.

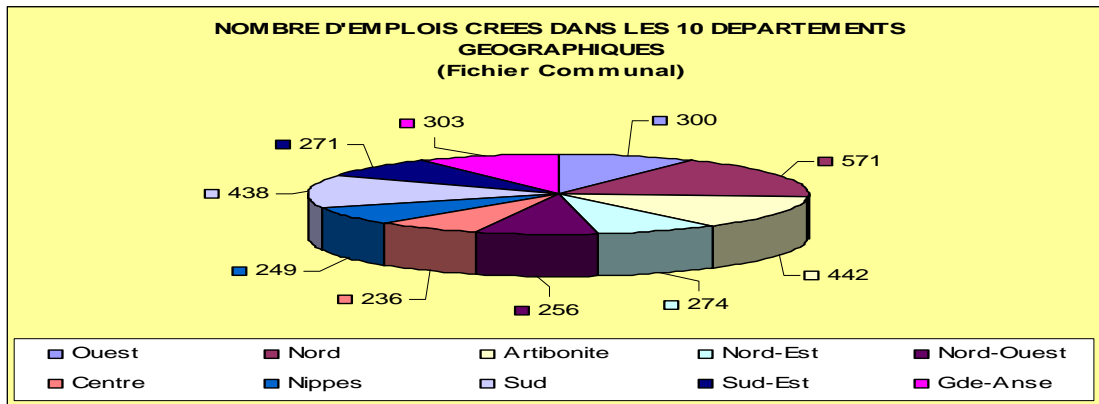

De même, la répartition géographique des dépenses effectuées à date pour la mise à jour du fichier communal se présente dans le graphique suivant.

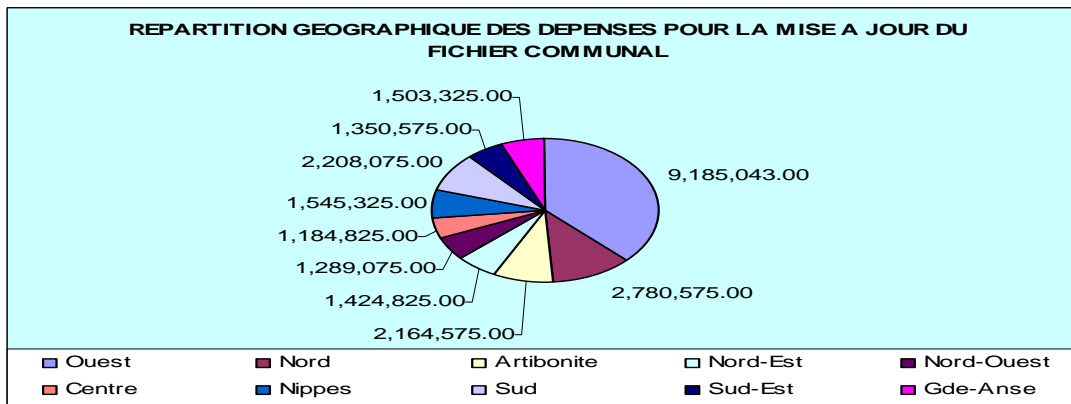

### 2.6.1.4 Soutien aux Etudiants

Ce volet exécuté par les Ministères de l'Agriculture, des Travaux publics et de la Santé, consiste dans l'encadrement des étudiants dans leurs domaines universitaires respectifs.

#### A. Monographie de l'Agglomération urbaine des communes du pays

L'objectif principal de cette activité est d'encadrer les étudiants finissants en Architecture, en Génie Civil, en Planification et gestion urbaine et en Aménagement du Territoire dans l'exécution d'un stage pratique en collecte des données en urbanisme et gestion urbaine. 165 étudiants des diverses facultés et/ou universités du pays y ont participé en faveur desquels 1,210.852.64 gourdes ont été dépensées sur les 1,343.356.57 de gourdes décaissées. A date, cette activité à la charge de la Coordinatrice Sectorielle

du Ministère des Travaux Publics, Transport et Communication est pratiquement achevée. On attend encore les exemplaires des monographies urbaines des principales villes chefs-lieux des communes.

### **B. Monographie agricole communale**


Le Ministère de l'Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) a offert à 146 étudiants (au lieu de 145 prévus dans le rapport d'étape #2 du PROREC) des facultés et universités du pays un stage de description et d'inventaire des ressources et potentialités agricoles des communes à travers le pays. A date, cette activité est achevée et a utilisé 741.331.40 gourdes des 1,117.997.90 de gourdes allouées. On attend encore les exemplaires des monographies agricoles des communes.

### **C. Amélioration de la couverture vaccinale**

Dans le rapport d'étape #2 du PROREC, le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) avait envisagé d'exécuter le projet d'amélioration de la couverture vaccinale dans deux (2) départements géographiques du pays : Les Nippes et l'Ouest. Toutefois, les responsables de ce Ministère ont décidé d'exécuter cette activité uniquement dans le département de l'Ouest avec Quatorze (14) superviseurs et Quatre Vingt Quatorze (94) vaccinateurs, un total de 108 étudiants pour une période de deux (2) mois.

Une avance de fonds de 484.365.00 gourdes a été consentie par la Coordination Générale du PROREC pour la réalisation du séminaire de formation, le paiement de 50% des indemnités mensuelles des superviseurs et vaccinateurs, la supervision et la location de chevaux, avance qui jusqu'à présent n'est pas encore justifiée par le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP).


Le Volet Soutien aux Etudiants a permis l'embauche de 419 étudiants de diverses facultés et/ou universités du pays répartis à travers les dix (10) départements géographiques et le paiement d'indemnités pour un montant de 3.535.718 de gourdes comme le montre le graphique suivant




### III. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

L'ensemble du Programme au 30 septembre, excluant le sous-programme d'Infrastructures agricoles dont on ne dispose que d'informations partielles, a progressé par rapport aux résultats obtenus au 31 juillet et consignés dans le rapport d'étape No 2.

En effet, comparativement aux résultats consignés dans le rapport ci-dessus cité, le programme avait accusé un état d'avancement des activités de 47.5% au 31 juillet 2005 alors qu'au 30 septembre 2005, il accuse un état d'avancement de 62.7%, montrant une progression de 15.2% comme le montre le graphique suivant.

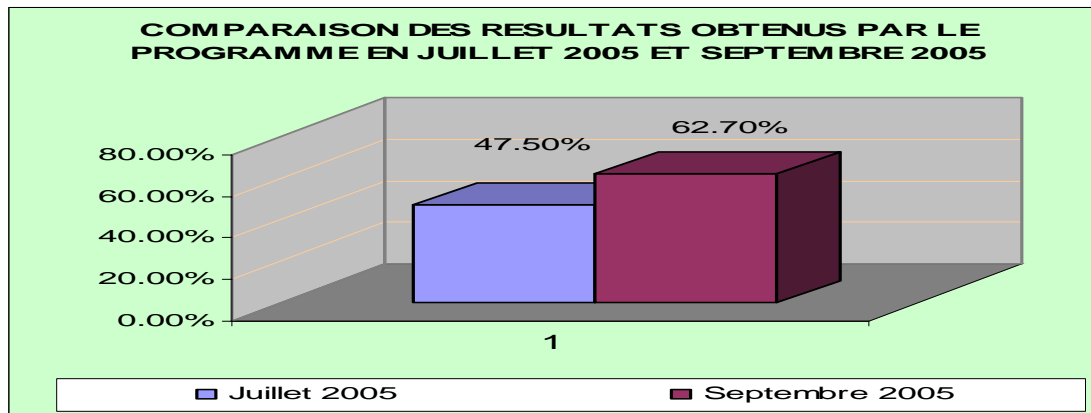


On peut donc conclure que malgré les écarts observés dans les procédures d'exécution des projets, surtout l'absence de régularité dans la soumission des rapports d'état d'avancement tant des activités que des dépenses effectuées, le programme a quand même progressé en termes de résultats obtenus à date par rapport à ceux obtenus en juillet dernier. Le graphique suivant montre la répartition en pourcentage des résultats obtenus par les différentes composantes du programme

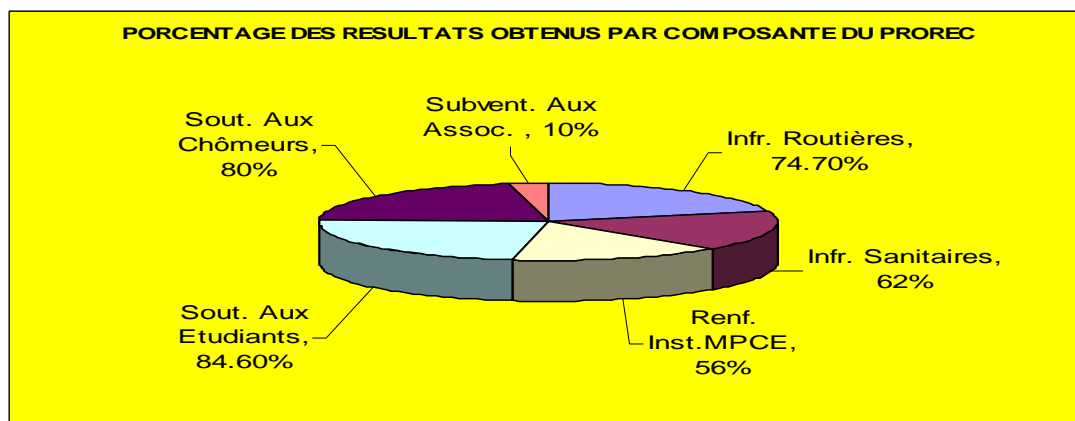

Au total le Programme de Relance Economique (PROREC) a décaissé au 30 septembre 2005 un montant de **715.865.431.00 de gourdes**, soit 60% des prévisions budgétaires rectifiées s'élevant à **1,331.878.500.00 de gourdes**. Ces décaissements sont répartis en

pourcentage selon les composantes du programme comme le montre le graphique suivant :

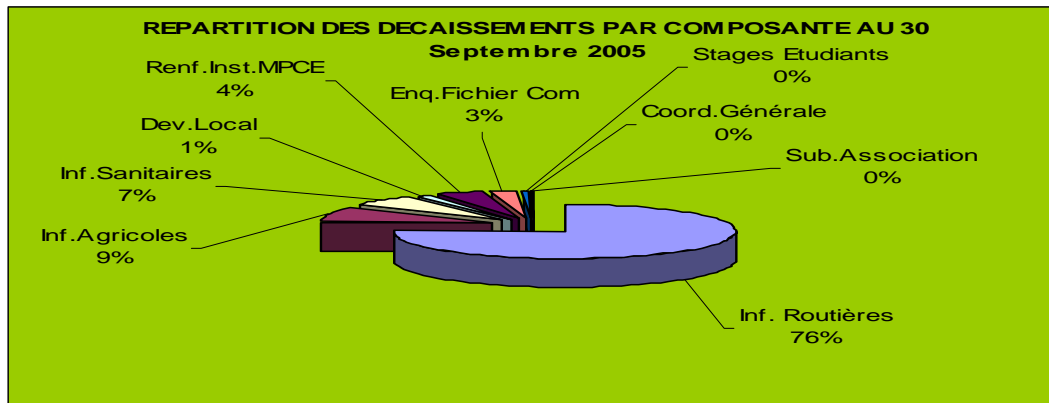


Le tableau suivant fournit les informations chiffrées concernant les prévisions budgétaires rectifiées, les montants effectivement décaissés ainsi que les montants des dépenses vérifiées au 30 septembre 2005 pour chaque composante du PROREC

COMPOSANTES/VOLETS	PREVISIONS BUDGETAIRES RECTIFIEES	DECAISSEMENTS (Gdes)	% Déc/Pré v.	DEPENSES VERIFIEES
1. Infrastructures Routières (MTPTC)	1.000.000.000.00	572.936.246.00	57.3%	208.890.157.00
2. Infrastructures Agricoles (MARNDR)	86.000.000.00	67.908.450.00	79.0%	-
3. Infrastructures Sanitaires (MSPP)	85.000.000.00	49.745.746.00	58.5%	13.276.646.00
4. Appui aux Initiatives de Dév. Local (MPCE)	10.000.000.00	10.000.000.00	100.0%	-
5. Renforcement Institutionnel (MPCE)	45.000.000.00	33.300.500.00	74.0%	-
6. Interventions Spécifiques (MEF)				-
6.1 Subventions aux associations	10.000.000.00	1.331.910.00	13.3%	1.331.910.00
6.2 Promotion Emplois Productifs	50.000.000.00	-	0.0%	-
6.3 Soutien aux Jeunes Chômeurs (F.com.)	31.453.500.00	19.059.500.00	60.6%	5.941.707
6.4 Soutien aux Etudiants	9.925.000.00	3.535.718.00	36.6%	1.952.183.00
6.5 Coordination Générale	4.500.000.00	1.347.861.00	30.0%	1.347.861.00
<b>TOTAL</b>	<b>1.331.878.500.00</b>	<b>759.165.931.00</b>	<b>60%</b>	<b>232.740.464.00</b>

On notera cependant que les montants des dépenses vérifiées pour toutes les composantes du programme ne prennent pas en compte toutes les dépenses effectuées par les Ministères concernés en faveur des projets inscrits au PROREC. Les informations obtenues de la Direction du Trésor du Ministère de l'Economie et des Finances ne mentionnent que les dépenses vérifiées à partir de décaissements partiels en faveur des projets. En effet, les pièces justificatives, transmises par les Coordinations Sectorielles du PROREC au sein des Ministères concernés pour les projets et par les Directions Départementales du Ministère de l'Economie et des Finances pour les stages d'étudiants et le Fichier Communal, n'ont pas été soumises, en tenant compte des premiers décaissements, et selon la nomenclature des dépenses comme exigé par les procédures en vigueur.

Le programme a contribué par ailleurs à la résorption du chômage des jeunes en créant des opportunités de travail à travers ses composantes. En effet, le Programme de Relance Economique (PROREC) au cours des trois derniers trimestres de l'année 2004-2005 a

contribué à créer ***12.900 emplois***. Une appréciation de l'impact du programme sur la création d'emplois durant cette période peut être faite à partir du graphique suivant.

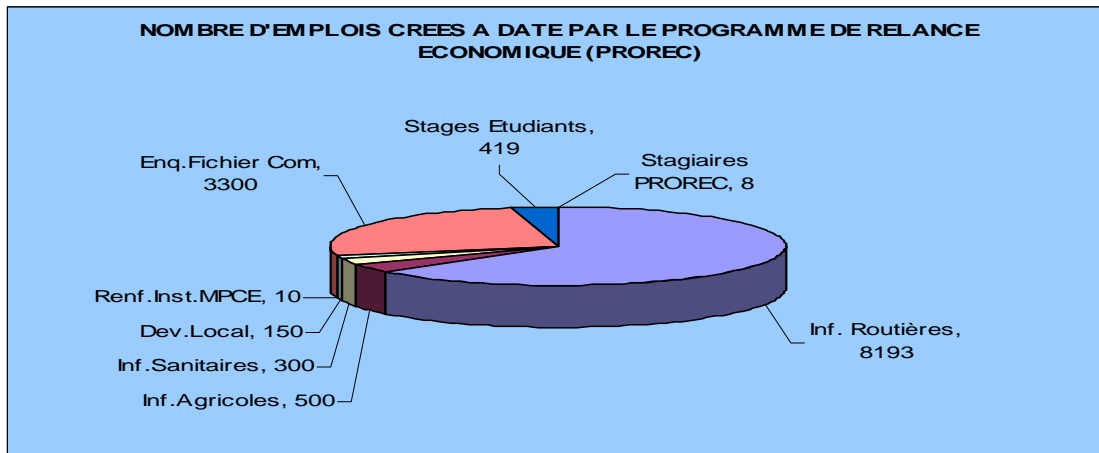

La Coordination Générale du PROREC espère fermement que pour le prochain rapport d'étape au 31 décembre 2005 tous les projets encore en exécution et ceux qui viennent de débiter seront achevés à la satisfaction des responsables et des bénéficiaires directs et indirects dans les dix départements géographiques du pays en fonction des attentes dudit programme à savoir :

- ⇒ la réhabilitation et la construction d'axes routiers urbains et ruraux
- ⇒ la réhabilitation et la construction d'infrastructures agricoles
- ⇒ la réhabilitation et la construction d'infrastructures sanitaires
- ⇒ la réalisation de micro projets générateurs de revenus
- ⇒ le renforcement des Directions Départementales des Ministères à vocation économique
- ⇒ l'encadrement d'un certain nombre d'associations/institutions à caractère social
- ⇒ la création d'un certain nombre d'emplois

## **ANNEXES**

**Annexe #1 Associations Subventionnées**

<b>Associations</b>	<b>Type de Projet</b>	<b>Localisation Villes/Départements</b>	<b>Date de Subvention</b>	<b>Subvention accordée en Gourdes</b>
1- Institut Nationale de Gestion et de Haute Etudes Internationale (INAGHEI)	Excursion Balnéaire aux Côtes des Arcadins	Port-au-Prince/Ouest	<b>1/08/2005</b>	50,000.00
2- Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes (MCFDF)	Alimentation Pour Volaille (Création de revenus pour 500 Familles)	Port-au-Prince/Ouest	<b>21/09/2005</b>	99,975.00
3- Comité de Gestion de Propriété Village Plus (CGPVP)	Matériels pour Centre de Couture	Port-au-Prince/Ouest	<b>12/10/2005</b>	81,791.00
4- Fondation Lefort Petit de Fond Droit (FOLEP)	Matériels pour Salon de coiffure	Petit Goâve / Ouest	<b>27/09/2005</b>	85,638.00
5- Fòk Youn Ede Lòt (FYEL)	Matériels pour Atelier d'ébénisterie	Anse Rouge/Artibonite	<b>20/09/2005</b>	99,914.96
6- Société de création d'activités et de développement National (SOCRADENA)	Matériels pour Atelier de briques	Carrefour/Ouest	<b>23/09/2005</b>	79,085.20
7- Association femme en Action (AFA)	Matériels pour Atelier de Couture	Arcahaie / Ouest	<b>7/09/2005</b>	57,000.00
8- Ecole Béthanie Soir	Aide Financière aux enfants en domesticité	Petite Rivière de l'Artibonite/Artibonite	<b>27/09/2005</b>	99.679.38
9- Ministère des Affaires Sociales	Camp d'Eté	Port-au-Prince/Ouest	<b>31/08/2005</b>	100,000.00
10- Fédération des Organisations de Carrefour Feuille (FOCAF)	Matériel pour Atelier d'ébénisterie	Port-au-Prince/Ouest	<b>25/10/2005</b>	85,814.55
11- Organisation Mouvement de la jeunesse haïtienne pour la paix (OMJHP)	Matériel pour atelier de ferronnerie	Port-au-Prince/Ouest	<b>10/10/2005</b>	96,205.00
12- Organisation des Frères Unis En Christ (OFUCH)	Cantine Pour enfants	Delmas /Ouest	<b>27/10/2005</b>	99,970.00
13-Global Realty	Projet d'infirmierie dans les écoles	Delmas /Ouest	<b>2/09/2005</b>	89.663.48
14-Atelier d'ébénisterie et des professionnels Salésiens (AEPS)	Matériels pour atelier d'ébénisterie	Port-au-Prince/Ouest	<b>23/09/2005</b>	81.791.73
15-Association Pour le Développement (BERACA)	Construction d'un complexe médical	Port-au-Prince/Ouest	<b>21/09/2005</b>	100.000.00
<b>TOTAL</b>				<b>1,306.528.30</b>

<b>Annexe #2 Associations non subventionnées</b>				
<b>Associations</b>	<b>Projets</b>	<b>Localisation Villes/Départements</b>	<b>Subvention en gourdes</b>	
			<b>Approuvée</b>	<b>Rejetée</b>
1. Groupe de support à la Société Civile (GSSC)	Centre d'Apprentissage aux jeunes démunis de bonbon et Abricots	Bonbon et Abricots/ Grande Anse	100.000.00	N'existe pas
2. Mouvman Peyizan Kok Chant (MOPEK)	Magazen Kominotè nan Kok Chant	Nan Kòk Chant/ Sud Est	100.000.00	N'existe pas
3. Combattant pour union National (CUN)	Atelier de ferronnerie	Port-au-Prince / Ouest	100.000.00	N'existe pas
4. Mouvement Peuple Haut Sanatorium (MPHS)	Atelier de couture	Port-au-Prince / Ouest	100.000.00	N'existe pas
5. Association des Enfants Démunis du Département de l'ouest (AEDEL)	Construction d'un salon de coiffure pour les jeunes de Martissant	Port-au-Prince / Ouest	100.000.00	N'existe pas
6. Société Coopérative Agricole de Pétion-Ville (SOCOADEP)	Prêts aux petits Marchands	Pétion-Ville/Ouest	100.000.00	N'existe pas
7. Société haïtienne pour l'encadrement des jeunes (SOHEJ)	Fonds de Prêts aux jeunes démunis de la Commune de Chantal	Chantal / Sud	100.000.00	N'existe pas
8. Centre haïtien d'Appui à la coupe et couture (CHACC)	Réhabilitation Ateliers confection St-Marc et Gonaïves	St Marc- Gonaïves / Artibonite	100.000.00	N'existe pas
9. Mouvement socioculturel pour le Développement de Petite Rivi. Art. (MOSDPRA)	Unité de moulage de produits céréaliers	Petite Riv. Art. /Artibonite	100.000.00	N'existe pas
10. Fondation ORIJUTHEL	Encadrement des enfants de la commune de l'Estère	Estère/Artibonite	100.000.00	N'existe pas
<b>TOTAL</b>			<b>1,000.000.00</b>	

<b>Annexe#3 Dossiers à l'étude</b>			
<b>Projets</b>	<b>Institutions</b>	<b>Villes / Départements</b>	<b>Subvention Approuvée</b>
1-Canalisation eaux irrigation à Piatre	Comité de Développement Piatre (CPDP)	Piatre / Artibonite	100.000.00
2-Réfection routes à Gressier	Groupe de journalistes Indépendants pour l'avancement Social d'Haïti (GIJASH)	Gressier / Ouest	100.000.00
3-Centre de service en faveur des étudiants	Rassemblement des Etudiants Capois (REC)	Cap-Haïtien / Nord	100.000.00
4-Micro-crédit	Koperativ Kombit Jèn Ayisyen (KOJAKOP)	Port-au-Prince / Ouest	100.000.00
5-Reboisement partiel du Morne de l'hôpital	Action dans les communautés Religieuses pour le développement de l'Humanisme et de la Spiritualité	Port-au-Prince / Ouest	100.000.00
6-Assainissement de la petite Rivière de Nippes	Organisation pour le développement de Petite Rivière des Nippes (ODPRN)	Petite Riv des Nippes / Nippes	50.000.00
7-Ti Magazen Pécheurs	Association des pêcheurs du Village de Dieu (APVD)	Port-au-Prince/ Ouest	100.000.00
8-Construction d'un établissement scolaire	Missionnaires Oblats de Marie immaculée Paroisse St Joseph de Damassin (sud)	Damassin / Sud	100.000.00
9-Programme sur la problématique des jeunes défavorisés des quartiers populaires de la Capitale	Association des jeunes démocrates pour le changement (AJDC)	Port-au-Prince / Ouest	100.000.00
10-Projet de Pêche	Association de Pêche de Carrefour (APC)	Carrefour / Ouest	100.000.00
11-Championnat d'Eté Foot-Ball	Mairie des Baradères/Association des Jeunes pour le Développement des Baradères (AJDB)	Baradères/ Nippes	50.000.00
12-Cantine populaire dans le quartier de Puits Blain	Mains Directives d'Aide au Développement d'Haïti(MADAH)	Port-au-Prince / Ouest	100.000.00
13-Cours d'été pour les jeunes	Collectif des Etudiants Universitaires d'Haïti	Port-au-Prince / Ouest	100.000.00
14-Appui aux petits commerçants	Koperativ Kredipaw (KOKPA)	Port-au-Prince /Ouest	100.000.00
15-Aménagement structures Environnement à Fermathe	Ministère de la Culture et de la Communication	Fermathe / Ouest	100.000.00
<b>SOUS TOTAL (A)</b>			<b>1,400.000.00</b>

**Annexe#3 Dossiers à l'étude (Suite)**

<b>Projets</b>	<b>Institutions</b>	<b>Villes / Départements</b>	<b>Subvention Approuvée</b>
16-Restaurant communautaire	Association des hommes en action pour le progrès des habitants démunis AHAPHE	Port-au-Prince / Ouest	100.000.00
17-Matériel pour atelier de Ferronnerie	Renforcement des Dignités Haïtiens pour le Changement	Port-au-Prince / Ouest	100.000.00
18--Entreprise de vidéographie	Organisation des Jeunes Chômeurs	Port-au-Prince / Ouest	100.000.00
19-Atelier de couture	Rassemblement Paysan Haïtien RPH	Port-au-Prince / Ouest	100.000.00
21-Réalisation d'un camp d'été	Association Juvénile de l'Eglise Chrétienne de Delmas	Delmas / Ouest	100.000.00
22-Salon de coiffure	Centre d'Assistance pour les Orphelins de Développement	Port-au-Prince / Ouest	100.000.00
23- Matériel pour atelier de Ferronnerie	Rassemblement tout moun se moun (RTSM)	Port-au-Prince / Ouest	100.000.00
24- Projet de cantine	Organisation des jeunes Combattants pour une nouvelle Société (OJCNS)	Port-au-Prince / Ouest	100.000.00
25-Prêts aux femmes	Association des Militants de Petit Goâve	Petit Goâve/Ouest	100.000.00
26- Construction de Latrines	Groupe d'intervention pour le développement de Camp-Perrin (GIDEC)	Camp-Perrin/ Sud	100.000.00
27-Camp D'été	Collège Chrétien de Grand Goâve	Grand Goâve / Ouest	100.000.00
28-Assainissement de la zone de Bicentenaire	Plaidoirie pour la Défense des Droits des Démunis (PLADDEM)	Port-au-Prince / Ouest	62.800.00
29- Assainissement	Association des Jeunes Progressistes de Martissant (AJPM)	Martissant / Ouest	100.000.00
30- Salon de coiffure	Organisation pour le Changement et le développement de Martissant (OCDM)	Martissant / Ouest	100.000.00
31-Unité de secours et d'intervention en cas de catastrophes naturelles	Eglise Adventiste du 7 <sup>ème</sup> Jour	Port-au-Prince / Ouest	100.000.00
32-Projet de pêche	Solidarité des planteurs pour le développement de l'Anse-à-Veau (SOPDA)	Anse-à-Veau/Nippes	100.000.00
<b>SOUS TOTAL (B)</b>			<b>1,562.800.00</b>

**Annexe#3 Dossiers à l'étude (Suite)**

<b>Projets</b>	<b>Institutions</b>	<b>Villes / Départements</b>	<b>Subvention Approuvée</b>
33-Construction de salles de classe	Paroisse Saint Joseph	Damassin/ Sud	100.000.00
34-Centre de couture	Comité de Gestion de Propriété Village Plus	Port-au-Prince / Ouest	100.000.00
35- Matériel pour atelier de Ferronnerie	Association des Militants Pour le Développement de Petit Goâve	Petit Goâve / Ouest	100.000.00
36-Achat de maïs en grain	Oganizasyon Peyizan Kolade	Kolade / Centre	100.000.00
37- Ecole Professionnelle	Fondation Rayon Espoir	Delmas / Ouest	100.000.00
38- Matériel pour atelier de Ferronnerie	Organisation des Jeunes Combattants de Haute Guinaudée (OJCHG)	Jérémie/Grand'Anse	100.000.00
39-Camp d'été	Eglise Chrétienne de Delmas	Delmas /Ouest	100.000.00
40-Cantine Pour enfants	Organisation des Frères Unis En Christ d'Haïti (OFUCH)	Delmas/Ouest	100.000.00
41-Réhabilitation école des Petits Enfants Réunis	Organisation La Paix pour le Changement du Pays (OPCP)	Maniche/Sud	100.000.00
42-Distribution de vêtements, de nourriture et de fourniture scolaire	Programme d'aide aux jeunes et aux enfants démunis (PAJED)	Delmas / Ouest	100.000.00
43-Matériel de Génie Civil	Union des Ingénieurs pour le Développement de la Grand'Anse (UNIDGA)	Jérémie / Grand'Anse	100.000.00
<b>SOUS TOTAL (C)</b>			<b>1,000.000.00</b>

**Annexe#3 Dossiers à l'étude (Suite)**

<b>Projets</b>	<b>Institutions</b>	<b>Localisation</b>	<b>Subvention Approuvée</b>
44-Atelier d'ébénisterie	Mouvement des paysans Commune de Grande Saline (MOPACOGRAS)	Grande Saline /Artibonite	100.000.00
45-Nettoyage de la zone de Pont Rouge	Rénovateurs et défenseurs Haïtiens (RDH)	Pont Rouge/Ouest	50.900.00
46- Matériel pour atelier de Ferronnerie	Jeunes Progressistes de Sapotille pour le Développement de Carrefour	Carrefour/ Ouest	100.000.00
47-Encadrement des jeunes filles	Femme 2000	Port-au-Prince / Ouest	100.000.00
48-Atelier de Soudure	Organisation des Jeunes progressistes pour le Développement de Pochette	Lazile / Sud	100.000.00
49-Assainissement	Organisation pour la reconstruction et le développement de Martissant	Port-au-Prince /Ouest	100.000.00
50- Atelier d'ébénisterie	Jeunes Organisation en Mouvement pour l'Eradication du SIDA en Haïti	Port-au-Prince / Ouest	100.000.00
51-Centre Professionnel pour les jeunes défavorisés de Cité Soleil	Association des Chômeurs Haïtiens	Port-au-Prince /Ouest	91.650.00
52-Atelier de Bougies	Collectif pour l'Education et le Développement des Jeunes de Fontamarra 43 (CEDJF)	Carrefour / Ouest	100.000.00
53-Salon de coiffure	Union des Jeunes des Progressistes pour le Développement de l'Ouest (UJPDO)	Port-au-Prince /Ouest	100.000.00
54- Salon de coiffure	Fondation Internationale pour la Réhabilitation des Démunis (FIRD)	Pétion-Ville / Ouest	100.000.00
555-Construction d'école en faveur des enfants démunis	Ann Konbat Delenkans (AKD)	Delmas / Ouest	100.000.00
56- Matériel pour atelier de Ferronnerie	Association Chrétienne des Elus de Dieu pour le Développement (ACEDD)	Port-au-Prince / Ouest	100.000.00
57-Construction école communautaire	Centre de Formation Intégrée pour le Développement Régional (CEFIDER)	Dame Marie/ Grand'Anse	100.000.00
58- Centre de couture	Union des Chrétiens pour la Propagation de l'Evangile et du Développement Communautaire (UCPEDC)	Port-au-Prince / Ouest	100.000.00
<b>SOUS TOTAL (D)</b>			<b>1,342.550.00</b>

<b>Annexe#3 Dossiers à l'étude (Suite)</b>			
<b>Projets</b>	<b>Institutions</b>	<b>Localisation</b>	<b>Subvention Approuvée</b>
59-Salon de coiffure	Coordination Révolutionnaire Mission pour le Peuple	Port-au-Prince /Ouest	66.500.00
60- Matériel pour atelier de Ferronnerie	Men Kontre Pou Devlopman Kafou (MENKODEK)	Carrefour / Ouest	100.000.00
61- Matériel pour atelier de Ferronnerie	Mouvement des Haïtiens Progressistes pour le Développement de Carrefour	Carrefour/ Ouest	100.000.00
62-Construction de 6 salles de classe	Association des Agents de Développement de Suire (ADES)	Cayes/Sud	100.000.00
63-Construction d'une école	Communauté Evangélique de Gador	St Louis du Sud/Sud	100.000.00
64-Implantation Système d'eau potable	Organisation pour le Relèvement de Charpentier	Cayes/Sud	100.000.00
65-Latrénisation	Association pour le Développement Morency	Cayes/Sud	100.000.00
66-Formation en faveur des jeunes Défavorisés	Organisation des Jeunes de la Savanne (OJS)	Cayes/Sud	39.550.00
67-Construction 250 latrines	Kòdinasyon Oganizasyon Peyizan Twazièm Tobèk (KOPETT)	Torbeck/Sud	100.000.00
68- Financement des Ecoliers	Groupe Scout les Brebis de Baden Powel (ANSH/GSBBP)	Cayes/Sud	98,431.00
69- Construction d'une école	Ecole Communautaire El Shadaï de Bigarousse	Cayes/Sud	100.000.00
70- Réhabilitation d'un système d'eau potable	Organisation Paysanne pour le Développement de la Hatte (OPDH)	Roche à bateau/Sud	29.825.00
71- Système d'eau potable	Organisation des Gens Progressistes pour le Développement de Damassin et ses Environs (OGPDDE)	Damassin/Sud	100.000.00
72- Irrigation plaine de Torbeck	OJDDEC/AJDET	Torbeck/Sud	35.000.00
<b>SOUS TOTAL (E)</b>			<b>1,069.306.00</b>

**Annexe#3 Dossiers à l'étude (Suite)**

<b>Projets</b>	<b>Institutions</b>	<b>Localisation</b>	<b>Subvention Approuvée</b>
73-Latrines familiales	Haiti Vision INC.	Petit Goâve/Ouest	100.000.00
74- Réhabilitation d'une école	Organisation la Paix pour le changement du pays (OPCP)	Maniche/Sud	100.000.00
75- Parrainage d'enfants démunis	Les Amis du Centre Les Frères Jumeaux (ACEFJU)	Port-au-Prince/Ouest	100.000.00
76- Financement en faveur des enfants démunis	Foyer des Enfants Démunis (FED)	Delmas/Ouest	100.000.00
77- Construction de latrines	Fédération des Organisations pour l'Avancement de la 3 <sup>ème</sup> Circonscription de Port-au-Prince	Port-au-Prince/Ouest	100.000.00
78 Réhabilitation de l'école Natal de Durocher	Ecole Natal de Durocher	Cavaillon/Sud	63.030.00
79- Implantation Entreprise de Ferblanterie	Association Unité des Ferblantiers Professionnels (AUFEP)	Port-u-Prince/Ouest	100.000.00
80-Nettoyage la zone défavorisée de Petite Place Cazeau	Fédération des Organisations Haïtiennes de Développement (FORHAD)	Port-au-Prince/Ouest	100.000.00
81-Demande d'achat de 1000 Bracelets	Fondation Seguin	Pétion-Ville/Ouest	100.000.00
82- Implantation Atelier de Couture	Comité pour le Développement de St Antoine de Gressier	Carrefour/Ouest	100.0000.00
83-Réaménagement d'un poulailler communautaire	Service Paysan	Pétion-Ville/Ouest	100.000.00
84-Implantation restaurant Communautaire	Fondation Haïrtienne pour la Réhabilitation des Défavorisé (FHARED)	Croix-des-Bouquets/Ouest	100.000.00
85-Atelier de Soudure	Association des jeunes Professionnels Engagés	Jérémie /Grand' Anse	100.000.00
86-Implantation Salon de coiffure	Génération JHA	Port-au-Prince/Ouest	100.0000.00
<b>SOUS TOTAL (F)</b>			<b>1,263.030.00</b>

<b>Annexe#3 Dossiers à l'étude (Suite)</b>			
<b>Projets</b>	<b>Institutions</b>	<b>Localisation</b>	<b>Subvention Approuvée</b>
87-Implantation Salon de coiffure	Coordination Révolutionnaire Mission pour le peuple (CRMPP)	Port-au-Prince/Ouest	66.500.00
88-Matériels pour augmenter capacité d'accueil du centre	Centre d'Action pour le Développement (CAD)	Port-au-Prince/Ouest	100.000.00
89- Ouverture Salon de coiffure	Association des Jeunes pour le Développement de la Plaine du Cul de Sac (AJDSPS)	Port-au-Prince/Ouest	100.000.00
90- Cantine populaire	Fondation d'Assistance et Réhabilitation des Enfants Démunis de Constant (FAREDCA)	Les Anglais/Sud	91.075.00
91-Ouverture de salon de coiffure	Organisation des Jeunes pour la Restructuration Sociale (OJRS)	Port-au-Prince/Ouest	100.000.00
92-Ouverture salon de coiffure	Organisation Nationale Etoile de la Paix pour le Progrès d'Haïti (ONEPPH)	Port-au-Prince/Ouest	100.000.00
93-Ecole Professionnelle	Solidarite Ant Jèn Site Solèy (SAJESS)	Port-au-Prince/Ouest	95.925.00
94-Ecole Professionnelle	Jeunesse Haïtienne en Action pour le Développement de la CARIDAD et de ses Environs (JHADECE)	Port-au-Prince/Ouest	51.300.00
95- Matériels pour école communautaire <i>Lauriers Rose</i>	Organisation populaire pour le Changement de Drouillard (OPCD)	Port-au-Prince/Ouest	78.200.00
96-Scolarisation 45 enfants démunis	Solidarité Générale d'Initiative pour le Développement Economique et Social (SOGIDES)	Delmas/ouest	100.000.00
97- Latrines familiales	Union des paysans pour le Développement de Limonade (UPDELL)	Limonade/nord	100.000.00
98- Renforcement d'un atelier d'ébénisterie	Association des Trois Professionnels en Ebénisterie	Delmas/Ouest	100.000.00
<b>SOUS TOTAL (G)</b>			<b>1,083.000.00</b>

<b>Annexe#3 Dossiers à l'étude (Suite)</b>			
<b>Projets</b>	<b>Institutions</b>	<b>Localisation</b>	<b>Subvention en gdes</b>
99- Implantation centre de couture	Oganizasyon kay Batay pou yon Devlopman pi Bèl ak yon Demokrasi (OBADBED)	Pétion-Ville/Ouest	100.000.00
100- Ouverture atelier de Couture	Association des Jeunes Pour le Développement de Delmas (AJDD)	Delmas/Ouest	100.000.00
101- Cantine populaire	Oganizasyon Batay Absoli pou Devlopman Dirab Akèy Kòt a Kòt (OBADDAK)	Port-au-Prince/Ouest	32.550.00
102-- Ouverture Ecole de couture	Comité Directif pour l'Avancement de Bellevue (CODABELL)	Port-au-Prince/Ouest	100.000.00
103-- Projet de Cantine Scolaire	Ecole Communautaire Dumarsais Estimé	Delmas/Ouest	100.000.00
104- Ouverture de salon de coiffure	Société Francophone des Amis de la Culture de l'Art et du Développement (SOFACAD)	Port-au-Prince/Ouest	76.500.00
105- Ecole communautaire à Léogâne	Organisation des Paysans pour le Développement des Citroniers (ORPEDEC)	Léogâne/Ouest	100.000.00
106- Ecole communautaire	Mouvement Alternatif des Citoyens haïtiens pour le Progrès Socio-économique (MACHAPS)	Port-au-Prince/Ouest	33.038.70
107- Encadrement d'enfants des zones défavorisés	Ecole Mixte Jésus est mon Sauveur	Port-au-Prince/Ouest	100.000.00
<b>SOUS TOTAL (H)</b>			<b>642.088.70</b>
<b>TOTAL</b>			<b>9,362.774.70</b>

**Annexe #4 Projets Non Eligibles**

<b>Associations</b>	<b>Projets</b>	<b>Raison de la non subvention</b>
1. Centre d'Accompagnement pour le Développement Socio-éducatif des Enfants d'Haïti (CENADESEH)	Programme d'Assistance et de Conseil aux Enfants	Activité n'est pas génératrice de revenus aux profits des démunis
2. Centre Moderne pour l'Avancement des Jeunes (CEMOPAJ)	Demande d'aide financière pour achat de matériels informatiques	Le PROREC ne subventionne pas ce genre de projet
3. Comité de gestion de l'Ecole Communautaire Guillaume Poupon	Demande de subvention pour l'implantation d'un ciné-club	Activité n'est pas génératrice de revenus aux profits des démunis
4. Mouvement des Paysans Progressistes pour le Développement de l'Artibonite (MOPAPDEVA)	Demande d'aide financière pour achat de matériels informatiques	Le PROREC ne subventionne pas ce genre de projet
5. Coalition des Mouvements de Masses pour la Sauvegarde et l'Avancement de la Démocratie (COMMSAD)	Demande d'électrification de la Zone de Martissant 2B	Activité n'est pas génératrice de revenus aux profits des démunis
6. Fédération Nationale de la Jeunesse Haïtienne (FENAJEH)	Demande de financement en vue de la participation de dix (10) étudiants au 16 <sup>ème</sup> Festival Mondial des Jeunes Vénézuéla	Le PROREC ne subventionne pas ce genre de projet
7. Organisation Nationale Etoile de la Paix pour le Progrès d'Haïti (ONEPPH)	Demande de financement pour l'acquisition d'un local et le paiement des employés de l'organisation	Activité n'est pas génératrice de revenus aux profits des démunis
8. Destination Djondjon	Demande d'aide financière pour réaliser un projet sur le développement touristique durable	Le PROREC ne subventionne pas ce genre de projet
9. Larochele Rony	Demande de subvention pour réaliser des études en télécommunications	Activité n'est pas génératrice de revenus aux profits des démunis
10. Danié Diga	Demande d'aide financière pour la construction d'une maison	Activité n'est pas génératrice de revenus aux profits des démunis
11. Association des Jeunes Etudiants, Elèves Progressistes pour le Développement de Sarthe et des Ses Environs (AJEEDSE)	Demande de subvention pour l'achat de trois (3) ordinateurs	Activité n'est pas génératrice de revenus aux profits des démunis
12. Association des Jeunes Informaticiens des Jérémie (AJIJ)	Demande d'aide Financière pour l'acquisition d'une génératrice	Activité n'est pas génératrice de revenus aux profits des démunis
13. Organisation pour le Développement Graduel et Durable du pays (ODGDP)	Demande de subvention pour la réalisation d'un projet d'éducation civique	Activité n'est pas génératrice de revenus aux profits des démunis
14. André Denel	Demande d'aide financière pour réaliser des études universitaires	Activité n'est pas génératrice de revenus aux profits des démunis
15. Association des Techniciens en informatique de Léogâne (ASTIL)	Demande d'aide financière pour l'acquisition de matériels informatiques	Activité n'est pas génératrice de revenus aux profits des démunis

**Annexe #4 Projets Non Eligibles (Suite)**

<b>Associations</b>	<b>Projets</b>	<b>Raison de la non subvention</b>
16. Scout Nissage Saget	Demande d'assistance financière pour favoriser la publication des résultats d'une enquête réalisée à St Marc.	Activité n'est pas génératrice de revenus aux profits des démunis
17. Lutte des Jeunes pour le Développement de la Petite Rivière del' Artibonite (LJDRA)	Demande d'aide pour réaliser un projet d'éducation civique	Le PROREC ne subventionne pas ce genre de projet
18. Réseau de Développement Durable d'Haïti (RDDH)	Demande d'aide financière pour un projet de Soutien Stratégique aux organisations de la société civile	Activité n'est pas génératrice de revenus aux profits des démunis
19. Mairie de Borgne	Demande de soutien financier pour un projet d'Endiguement des Eaux Pluviales	Activité n'est pas génératrice de revenus aux profits des démunis
20. Fédération Sud pour le Respect Droits Humains (FSRDH)	Demande d'appui financier pour exécuter un séminaire sur l'éducation civique	Activité n'est pas génératrice de revenus aux profits des démunis
21. Regroupement des Jeunes Intellectuels pour le Développement d'Haïti (REJIDH)	Demande d'appui financier pour exécuter un séminaire sur la Protection de l'Environnement	Activité n'est pas génératrice de revenus aux profits des démunis
22. Service Paysan	Demande d'aide pour l'acquisition de matériels pour un centre professionnels	Activité n'est pas génératrice de revenus aux profits des démunis
23. Groupe de recherche en Administration (GRA)	Demande d'aide financière pour réaliser un projet d'Appui à l'amélioration de la gestion et de fonctionnement des Institutions scolaires (publiques et privées)	Activité n'est pas génératrice de revenus aux profits des démunis
24. Editions Champion	Demande de subvention pour faire la promotion du Ministère de l'Economie et des Finances dans le magazine Editions Champion	Activité n'est pas génératrice de revenus aux profits des démunis

**Annexe #5 Projets Répétitifs**

<b>Associations</b>	<b>Type de projet</b>	<i>Raisons de la suspension</i>
1-Oganizasyon Batay Absoli pou Devlopman Dirab Akey Kòt a Kòt (OBADDAK)	Ouverture d'un salon de coiffure	Trop de demande pour cette catégorie de projet
2-Organisaion des Jeunes Actifs de Descayette (OJAD)	Ouverture d'un salon de coiffure	Trop de demande pour cette catégorie de projet
3-Comité des Victimes de la Ruelle Vaillant	Ouverture d'un salon de coiffure	Trop de demande pour cette catégorie de projet
4-Société des Amis Bolosse pour l'Art et le Développement (SABAD)	Ouverture d'un salon de coiffure	Trop de demande pour cette catégorie de projet
5-Association des Militants pour le Développement de Petit Goâave (AMPDG)	Micro-crédit en faveur des femmes	Cette Association a déjà un projet à l'étude
6-Organisation Pour la Protection et la Réinsertion des Enfants Démunis d'Haïti (OPREDHA)	Atelier d'ébénisterie	Trop de demande pour cette catégorie de projet
7- Fondation Haïtienne d'Encadrement et de Développement Economique (FONHEDEC)	Demande de matériels pour entreprises d'ébénisterie, de ferronnerie, de couture et de mahogany	Cette association a soumis quatre (4) projets
8-Association des Jeunes pour le Développement de Delmas (AJDD)	Ouverture d'un salon de coiffure	Trop de demande pour cette catégorie de projet
9- Organisation Haïtienne pour un Nouveau Cadre de Développement Socio-économique (CONHSEDE)	Ouverture d'un salon de coiffure	Trop de demande pour cette catégorie de projet
10-Rassemblement Pour le Changement et Développement de Bolosse (RCDB)	Ouverture d'un salon de coiffure	Trop de demande pour cette catégorie de projet
11- Organisation Haïtienne pour un Nouveau Cadre de Développement Socio-économique (CONHSEDE)	Atelier de ferronnerie	Trop de demande pour cette catégorie de projet
12-Association des jeunes pour le Développement de Delmas (AJDD)	Ouverture d'un salon de coiffure	Trop de demande pour cette catégorie de projet
13-Mouvement et Action Légaux des Ressources Humaines	Ouverture d'un salon de coiffure	Trop de demande pour cette catégorie de projet

### Annexe#6 Projets de Promotion de l'emploi Productif

Institutions	Projets	Localisation	Financement Sollicité
1-Haïti Culture Magasine	Publication d'un magazine	Ouest	837.870.00 gdes
2-H et G Construction	Ouverture d'une entreprise de matériaux de construction	Ouest	1.387.650.82 gdes
3-Info-Express	Restructuration d'une école Informatique à Ganthier	Ouest	1.900.000.00 gdes
4-Alliance pour le Développement de Maïs Gaté	Ouverture d'un restaurant Communautaire	Ouest	100.000.00 gdes
5-Finesse Arts	Renforcement d'un atelier d'Art	Ouest	8.707.060.00 gdes
6-Myaggy Kredi Pam	Relance Econique de l'entreprise	Ouest	450.000.00 gdes
7-Naturicin	Production de l'Huile de ricin	Ouest	20.165.00 US\$
8-Association des Paysans de Vallée	Augmenter le niveazu de production e l'entreprise TOPLA	Sud	1.500.000.00 gdes
9-Société Haïtienne d'Agro Insdusrtrie S.A	Relance de la production de tomate dans l'Aribonite	Artibonite	1,350.000.00 gdes
10-Ecole Professionnelle LCM Cyber Café	Relancer l'entreprise	Ouest	5.580.00 US\$
11-Men Kontre Boulangerie	Ouverture d'une boulangerie	Ouest	1.263.625.00 gdes
12-Ronet et Solange Store	Extension de l'entreprise	Ouest	2.000.000.00 Gdes
13-New Format Multi Services	Ouverture de l'Entrprise	Ouest	379.525.00 Gdes
14-Entreprise d'Aménagement de Terrains et de Travaux (EATT)	Paiement des dettes bancaires et consolidation de l'entreprise	Ouest	2,600.000.00 gdes
15-Touchnet Cyber Café	Ouverture d'un Cyber Café	Ouest	1.000.00 US\$
16-Amical dépôt Gazeuses	Ouverture de l'entreprise	Ouest	92.450.00 Gdes
17-Young Life Haïti	Production de bananas	Ouest	3,015.000.00 gdes
18-Groupe de Recherches et d'Action pour le Développement Economique et Social (GRADES)	Etablir un réseau d'exploitations agricoles modernes	Nord	69,361.490.00 gdes
19-Réseau des Ateliers du Fer	Réhabilitation de trois atelier de fer	Nord	473.527.50 gdes
